

# 枣庄市财政局

## 重点项目绩效评价报告

(农业农村类)

2022 年度

# 目 录

- 1、2022 年度枣庄市市级乡村振兴衔接资金项目

# 2022 年度枣庄市市级乡村振兴衔接资金项目 绩效评价报告

委 托 单 位：枣庄市财政局

项目主管部门：枣庄市乡村振兴局

评 价 机 构：山东山审会计师事务所有限公司



# 目录

摘 要	1
一、项目基本情况	1
(一) 项目立项背景及实施目的	1
(二) 项目预算安排和支出情况	2
(三) 项目主要内容和实施情况	3
二、项目绩效目标	3
(一) 总体绩效目标	3
(二) 2022 年度绩效目标	4
三、评价基本情况	4
(一) 绩效评价目的、对象和范围	4
(二) 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法和评价标准	5
(三) 绩效评价工作过程	6
四、评价结论和绩效分析	7
(一) 综合评价结论	7
(二) 绩效分析	8
(三) 项目主要成效及做法	9
五、存在问题及原因分析	11
六、有关建议	13
正文部分	15
一、项目基本情况	15
(一) 项目立项	15
(二) 项目预算	16
(三) 项目计划实施内容	17
(四) 项目组织管理	18
二、项目绩效目标	19
(一) 总体绩效目标	19
(二) 2022 年度绩效目标	20
三、评价基本情况	20
(一) 评价目的	20
(二) 评价对象与范围	21
(三) 评价依据	22
(四) 评价原则、评价方法	23

---

(五) 绩效评价指标体系 .....	25
(六) 评价人员组成 .....	26
(七) 绩效评价工作过程 .....	27
四、评价结论和分析 .....	28
(一) 综合评价结论 .....	28
五、绩效评价指标分析 .....	30
(一) 项目决策情况 .....	30
(二) 项目过程情况 .....	32
(三) 项目产出情况 .....	39
(四) 项目效益情况 .....	44
六、项目主要经验及做法 .....	48
七、存在的问题及原因分析 .....	50
八、意见建议 .....	52

## 摘 要

### 一、项目基本情况

#### (一) 项目立项背景及实施目的

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，深入贯彻中央经济工作会议精神，坚持稳中求进工作总基调，立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局、推动高质量发展，促进共同富裕，坚持和加强党对“三农”工作的全面领导，牢牢守住保障国家粮食安全和不发生规模性返贫两条底线，突出年度性任务、针对性举措、实效性导向，充分发挥农村基层党组织领导作用，扎实有序做好乡村发展、乡村建设、乡村治理重点工作，推动乡村振兴取得新进展、农业农村现代化迈出新步伐。

贯彻落实《中共中央 国务院关于实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的意见》（中发〔2020〕30号），依据《山东省财政厅 山东省乡村振兴局等5部门关于印发〈山东省财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法〉的通知》（鲁财农〔2021〕25号），枣庄市制定了《枣庄市财政局 枣庄市乡村振兴局 枣庄市民族宗教局关于印发〈枣庄市财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法〉的通知》（枣财农〔2021〕13号），明确资金支出方向和使用管理要求，优化资金使用方式，提高资金使用效益。财政衔接推进乡村振兴补助资金主要用于过渡期内巩固

拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。

## （二）项目预算安排和支出情况

2022年市级乡村振兴衔接资金预算资金总额为12,900.00万元，其中《枣庄市财政局关于下达2022年乡村振兴重大专项资金(市财政补助)预算指标的通知》（枣财农整指〔2022〕13号）下达资金9,760.00万元，《枣庄市财政局关于下达2022年乡村振兴重大专项资金(市财政补助)预算指标的通知》（枣财农整指〔2022〕24号）下达资金3,140.00万元，项目资金按照因素法进行测算，分配下达到六区一市及市乡村振兴发展中心。各区（市）2022年度枣庄市市级乡村振兴衔接资金预算和支出情况详见表1。

表1 各区市资金预算和支出情况表

区（市）	市级预算资金（万元）	市级支出资金（万元）	总计支出资金（万元）
滕州市	2,383.00	2,383.00	3,546.57
薛城区	1,442.00	1,442.00	1,575.13
山亭区	3,242.00	3,242.00	8,785.23
市中区	1,007.50	1,007.50	1,143.90
峯城区	2,040.00	2,040.00	3,879.26
台儿庄区	1,636.00	1,636.00	2,228.96
高新区	74.50	74.50	74.50
市乡村振兴发展中心	1,075.00	1,075.00	1,075.00
合计	12,900.00	12,900.00	21,164.65

### （三）项目主要内容和实施情况

#### 1.项目主要内容

项目涉及枣庄市6区1市（不含市直）及市乡村振兴发展中心，主要用于过渡期内巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，包括人居环境基础设施建设、产业项目、市级公益岗位补助、金融保险等支出。

#### 2.项目实施情况

资金主管部门为枣庄市财政局，负责制定市级财政补助资金管理办法，组织资金预算编制、执行和公开，制定资金分配方案，及时将项目资金拨付至各区（市），履行财政监督职责，做好绩效评价工作。项目主管部门为枣庄市乡村振兴局，负责建立健全财务管理规章制度，强化内部财务管理，优化业务流程，加强内部风险防控，督促监督项目实施情况。各区（市）乡村振兴局、相关业务主管部门履行申请材料审核职责，组织好巩固脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库的申请、申报、评审、审批等环节，项目完工后组织验收工作。2022年度枣庄市市级乡村振兴衔接资金共涉及164个项目，其中产业项目44个，基础设施项目120个。

## 二、项目绩效目标

### （一）总体绩效目标

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，全面落实中央农村工作会议和中央1号文件精神，推进乡村产业发展特别是产业扶贫、推进美



丽乡村建设特别是农村人居环境整治、基础设施提质改造，集中资源、强化保障，精准施策，加快补齐发展短板，促进农业高质量发展，实现农民高品质生活，推动乡村全面振兴，提升居民幸福感、归宿感和满意度，彰显魅力乡村建设新形象，新魅力，促进生态文明乡村的建设进程，发挥资金的整体效益，刺激带动当地经济发展。

## （二）2022年度绩效目标

严格落实资金拨付使用时限要求，保障资金用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接各项任务；预算执行率达100.00%，资金分配结果100.00%全额公告；年初项目库共入库项目494项，项目（工程）完成合格率达100.00%；各项目全过程及时录入防返贫系统，所有项目实施过程的必需环节进行全面公示公告；对于全国12317防止返贫监测和乡村振兴咨询服务平台实现零反馈问题；按项目紧迫性从巩固脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库中选择2022年市级乡村振兴衔接资金实施项目，有序推进项目建设，使得项目按时保质保量完成，着力加强项目资金监管，有效改善脱贫享受政策人员生活环境，拉动周边就业，提高经济收入。

## 三、评价基本情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围

#### 1.绩效评价目的

通过市级乡村振兴衔接资金绩效评价，客观公正地衡量市级

财政支出预期目标的实现程度，检验财政资金的支出效率和综合效果，及时发现存在的问题，提高单位的绩效管理水平和推动财政预算绩效工作健康发展，更好地完成过渡期内巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。

## 2.绩效评价对象和范围

本次评价对象为 2022 年度枣庄市市级乡村振兴衔接资金 12,900.00 万元，涉及的区市有市中区、峰城区、薛城区、台儿庄区、山亭区、高新区、滕州市和市乡村振兴发展中心，评价基准日为 2022 年 12 月 31 日。本次绩效评价对所有项目资料进行书面评审，同时对需要现场评价的项目进行现场评价，现场评价范围涵盖滕州市、高新区、薛城区、峰城区、山亭区和市乡村振兴发展中心。

### (二)绩效评价原则、评价指标体系、评价方法和评价标准

#### 1.评价原则和方法

严格遵循科学规范、绩效相关、公开透明、激励约束的关键原则，主要采用文献资料法、比较分析法、因素分析法、现场调研法和公共评判法，通过对绩效目标与实施效果、历史与当期的纵向比较、各区（市）之间的横向比较等，综合分析影响绩效目标实现及实施效果的各种原因，并结合专家评估、2022 年度枣庄市市级财政衔接资金问卷、管理者访谈及抽样调查等对 2022 年度枣庄市市级财政衔接资金实施效果进行评判，评价绩效目标的实现程度。

## 2.评价指标体系

依据《中共中央 国务院关于实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的意见》（中发〔2020〕30号）、山东省财政厅 山东省乡村振兴局等5部门《关于印发〈山东省财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法〉的通知》（鲁财农〔2021〕25号）、枣庄市财政局 枣庄市乡村振兴局 枣庄市民族宗教局《关于印发〈枣庄市财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法〉的通知》（枣财建〔2021〕13号）及《枣庄市市对下转移支付资金预算绩效管理办法》（枣政办字〔2020〕12号）文件要求，我们结合各地实际情况，将指标进行细化和分值设定。本次绩效评价有决策、过程、产出和效益4项一级指标，下设二、三级指标，总分值为100分。具体指标、指标解释、指标说明、评价标准、数据来源、证据收集方式等详见附表。

## 3.评价标准

依据《山东省省级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》（鲁财绩〔2020〕4号）及《枣庄市市对下转移支付资金预算绩效管理办法》（枣政办字〔2020〕12号）相关规定，分为4个等级：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

### （三）绩效评价工作过程

#### 1.前期准备阶段

我们与市财政局、市乡村振兴局相关业务科室进行了沟通，

充分了解了项目的基本情况，收集整理项目资料。对项目的发展规划、总体绩效目标、资金流向等内容进行了解，结合枣庄市2022年度评价方案及评价结果，形成了一套较科学、有针对性的项目实施方案。

## 2. 评价实施阶段

我们安排5人、分成1个现场评价组，对滕州市、高新区、薛城区、峰城区、山亭区和市乡村振兴发展中心进行现场评价；现场评价资金10,256.50万元，占市级资金总额的79.51%。

现场评价工作的主要内容，一是查看各类档案的完整性及合规性、政策执行的规范性等；二是查看市级乡村振兴衔接资金的拨付情况，通过与各级主管部门的具体负责人及经办人员座谈，了解资金的分配、预算执行以及政策执行等方面的情况；三是开展社会调查问卷，通过线上、线下或线上线下相结合的方式共收回调查问卷380份。

## 3. 综合分析阶段

本阶段的主要工作包括问卷分析、数据整理分析、赋值打分及结果分析等。

## 4. 报告撰写审核阶段

依据综合评价结果，撰写评价报告。

## 四、评价结论和绩效分析

### （一）综合评价结论

经综合评价，2022年度枣庄市市级乡村振兴衔接资金项目

绩效评价得分 88.00 分，评级为良。

## （二）绩效分析

### 1.综合评价结论分析

根据综合评价结果，各指标得分情况见表 2。

表 2 各指标得分情况表

指标	决策	过程	产出	效益	合计
分值	15	25	30	30	100
得分	13.00	21.50	28.00	25.50	88.00
得分率 (%)	86.67	86.00	93.33	85.00	88.00

#### （1）决策指标分析

决策指标分值 15 分，实际得分 13.00 分，得分率 86.67%，项目立项依据充分、具体程序规范，在绩效方面各个区（市）根据具体项目制定绩效目标，存在部分区（市）项目缺少产出指标，效益指标量化程度不足，不便于后期对项目的相关效益进行评价。

#### （2）过程指标分析

过程指标分值为 25 分，实际得分 21.50 分，得分率 86.00%。财务、业务管理制度健全，各项目主管单位建立了长效机制，预算执行率 100%，制度执行有效性完成度较好，但存在部分区（市）在收到市级资金后未在 30 日内向区（市）项目实施单位或项目实施主管部门下达补助资金、政府采购程序不合规、项目过程性资料留存不足的情况。

#### （3）产出指标分析

产出指标分值 30 分，实际得分 28.00 分，得分率 93.33%。

截至2022年12月31日，2022年年初计划项目建设任务均已实施，实际完成项目与年初计划项目建设任务较为相符，已完工项目均已完成验收，产出成本通过政府采购等方式得到有效控制，通过调查问卷分析，基础设施建设需求排名前三的为文化活动场所、健身器材和排污或排水管道。存在部分项目未按合同约定时间完工的情况，产出及时性欠佳。

#### （4）效益指标分析

效益指标分值30分，实际得分25.50分，得分率85.00%。评价认为，该项目一定程度上拉动周边就业，促进经济发展，增加村集体收益，从而拉动人均收入；人居环境改善，居民生活环境不断美化，幸福感提升。但存在部分项目截至评价日仍未投入使用，从而项目成效受限，对二三产业人才培养及人才招引有待进一步加强，各区（市）现阶段建设过程中对于财政资金的依赖程度较高，自筹资金及社会资本较少，对社会资本的吸引力有限。市派第一书记帮包村资金普遍投向于基础设施建设项目，然而基础设施建设项目可整合农村人居环境综合整治（美丽乡村建设）资金进行投入建设，市派第一书记帮包村资金未能够更多的投向产业项目。

### （三）项目主要成效及做法

#### 1.加强项目库建设管理

积极落实党中央、国务院关于实现巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴有效衔接的部署安排，围绕优势特色产业发展、农民群

众就近就地就业、多渠道增收等任务，坚持集中连片、突出重点实施衔接资金项目。按照《关于做好县级巩固拓展脱贫攻坚成果和衔接推进乡村振兴项目库建设管理的通知》（国乡振发〔2021〕3号）的要求，积极谋划2022年巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库，指导区（市）“先建机制、后建项目”，立足自身资源禀赋和区域优势，重点围绕乡村建设、乡村产业发展，因地制宜谋划一批惠长远、效益好、联农带农机制健全的项目。

## 2. 积极落实信息公开和公告公示制度

枣庄市严格按照国务院扶贫办 财政部印发《关于完善扶贫资金项目公告公示制度的指导意见》（国开办发〔2018〕11号）和《枣庄市扶贫资金项目公告公示实施细则》（枣扶贫组办字〔2018〕33号）的要求，对2022年以来所有下达的衔接资金的分配结果、项目计划安排情况、项目库建设情况、项目计划安排完成情况在市政府门户网站及时并长期公开，接受大众监督。严格执行项目入库、项目实施、收益使用等方面村、镇、区三级公示公告制度。不定期对区（市）公示公开结果开展抽查，确保公开信息全面及时。

## 3. 加强跟踪督促项目实施情况

各区（市）坚持完善专班负责的工作制度，确保每个镇街有项目工作专班、每个项目有管理专班；建立健全项目审核报备工作制度，各区（市）将年度衔接资金项目库、项目实施方案，在区（市）审批前报市局审核，审批后报市局备案；建立“红黄蓝”

项目建设预警制度，建立项目建设进度台账，收集项目进展的影像、照片、报账凭证等资料，实行定期通报推进项目进度，确保重点区域项目建设高质高效。

## 五、存在问题及原因分析

### （一）个别项目进度滞后，影响项目效益

一是截至评价日，部分完工项目存在验收通过但未投入使用的情况，一定程度上影响项目效益。如山亭区2022年徐庄镇青年回乡创业园项目12月29日山亭区乡村振兴局完成验收；滕州市柴胡店镇农旅融合观光木屋合作共建项目12月26日滕州市乡村振兴局完成验收，截至评价日，仍未投入使用，主要原因为项目租赁协议尚需商榷，租赁协议签订时间较晚；租赁方个人原因，投入进度缓慢。

二是部分项目未按合同计划时间完成施工，如峰城区2022年度古邵镇朱园村现代农业示范园二期项目，该项目计划开工日期为2022年6月24日，计划竣工日期为2022年9月22日，实际竣工日期为2022年11月25日；山亭区2022年度北庄镇农产品电子商务服务中心项目，该项目计划开工日期为2022年8月18日，计划竣工日期为2022年11月30日，截至现场评价日尚未竣工。延迟的主要原因为由于新冠肺炎疫情影响，各环节无法正常开展，原定各施工环节延迟；施工过程中遇到汛期，连续降雨导致项目无法正常施工；项目原料需定制且由定制厂家专业人员安装。



## （二）政府采购管理工作不到位，档案管理规范性需进一步加强

一是政府采购程序履行不当，如峰城区古邵镇朱园村现代农业示范园二期项目招标人委托第三方通过非政府网站“中国招标投标公共服务平台”发布招投标文件，未通过中国政府采购网、山东政府采购信息公开平台进行招投标。

二是因施工或监理单位未提供施工日志或监理日志等过程性资料，从而使主管单位缺少监管资料，造成部分项目在验收过程中存在质量问题，项目流程管理需进一步完善。

## （三）大部分实施项目为基础设施建设项目，政策落实效果有待加强

各区（市）实施项目均偏向于乡村生态环境提升中的基础设施建设项目，基础设施项目建设数量占比达到 73.01%，部分产业效益未充分体现，后续市场化程度难以预计，现有产业项目对于二三产业人才培养及人才招引有待进一步加强，各区（市）现阶段建设过程中对于财政资金的依赖程度较高，自筹资金及社会资本较少，2022 年度涉及市级资金项目建设总投资 20,400.14 万元，其中财政资金承担 20,279.15 万元，占总投资的 99.41%，对社会资本的吸引力有限，综合效益有待进一步加强。

## （四）绩效目标设定不完整，考核工作不到位

一是绩效目标设置的产出指标不够完整，效益指标不够细化、量化，不便于后期对项目的相关效益进行评价。

## 六、有关建议

### （一）提高项目投入产出进度，充分发挥资金效益

建议科学规划项目投入产出进度，积极联合各部门加强项目投入使用的推动引导和工作指导，积极推动项目进程，落实项目未实施的具体原因，科学规划重点项目、重点任务及重点工作，明确项目具体责任人员，科学确定并严格执行合理建设工期，加强组织领导，对中期调整事项完善相关调整手续，确保资金支付进度，防范财政资金风险，切实提高财政资金安全管理水平，凝聚提质增效合力，落实责任主体对项目的后续管理及维护，充分发挥资金效益。

### （二）加强政府采购管理，完善项目流程管理

建议各单位加强对各类采购活动的监管，进一步规范采购程序，定期对采购过程和结果进行监督检查。加强对采购商、供应商、评标专家等相关方面的诚信培育和监督，营造公开透明、公正公平的采购市场环境。严格按照《中华人民共和国政府采购法》等相关文件的要求在政府指定网站予以公示。项目单位加强项目的过程管理，进一步完善项目流程管理，避免出现过程管理不规范的情况，有效对施工过程进行监控，充分发挥财政资金的使用效益。

### （三）改善政策保障机制，项目建设规划立足当前着眼长远

产业发展是摆脱贫困的根本之策，要大力发展特色产业，推进一村一品、一县一业，形成稳定的产业链和供应链，产业规划

和实施需要更大的专业性，同时要求更显著的效益，更需要吸引专业化的社会资本加入。在不形成地方政府隐性债务的前提下，可采用以奖代补、先建后补等方式吸引各类资金支持衔接推进区等建设。整合同类型奖补资金，保障资金投入在政策支持的前提下提高使用匹配程度，对于资源良好、基础实施较好的乡镇，积极探索乡村特色产业，打造村镇产业升级版和经济增长极，带动村集体收益不断提升，对于资源短缺、基础薄弱的乡镇，积极完善基础设施建设，有效增强脱贫致富的内生动力，为巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接创造良好的环境。

#### （四）增强绩效管理意识，做实绩效管理工作

建议部门严谨编制绩效目标，根据预算绩效目标管理办法，进一步细化绩效目标内容，从数量、质量、时效等方面进行分解细化，提高乡村振兴衔接资金项目的管理效率。

## 正文部分

### 一、项目基本情况

#### (一) 项目立项

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，深入贯彻中央经济工作会议精神，坚持稳中求进工作总基调，立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局、推动高质量发展，促进共同富裕，坚持和加强党对“三农”工作的全面领导，牢牢守住保障国家粮食安全和不发生规模性返贫两条底线，突出年度性任务、针对性举措、实效性导向，充分发挥农村基层党组织领导作用，扎实有序做好乡村发展、乡村建设、乡村治理重点工作，推动乡村振兴取得新进展、农业农村现代化迈出新步伐。

党中央认为，从容应对百年变局和世纪疫情，推动经济社会平稳健康发展，必须着眼国家重大战略需要，稳住农业基本盘、做好“三农”工作，接续全面推进乡村振兴，确保农业稳产增产、农民稳步增收、农村稳定安宁。为贯彻落实《中共中央 国务院关于实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的意见》

（中发〔2020〕30号），依据《山东省财政厅 山东省乡村振兴局等5部门关于印发〈山东省财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法〉的通知》（鲁财农〔2021〕25号），枣庄市制定了《枣庄市财政局 枣庄市乡村振兴局 枣庄市民族宗教局关于印发〈枣庄市财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法〉的通知》（枣财

农〔2021〕13号），明确资金支出方向和使用管理要求，优化资金使用方式，提高资金使用效益。财政衔接推进乡村振兴补助资金主要用于过渡期内巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。

## （二）项目预算

2022年市级乡村振兴衔接资金预算资金总额为12,900.00万元，其中《枣庄市财政局关于下达2022年乡村振兴重大专项资金(市财政补助)预算指标的通知》（枣财农整指〔2022〕13号）下达资金9,760.00万元，《枣庄市财政局关于下达2022年乡村振兴重大专项资金(市财政补助)预算指标的通知》（枣财农整指〔2022〕24号）下达资金3,140.00万元，项目资金按照因素法进行测算，分配下达到六区一市及市乡村振兴发展中心，具体金额详见表3。

表3 各区市资金分配表

单位：万元

区（市）	枣财农整指 〔2022〕13号	枣财农整指 〔2022〕24号	合计
滕州市	1,460.00	923.00	2,383.00
薛城区	1,260.00	182.00	1,442.00
山亭区	2,880.00	362.00	3,242.00
市中区	900.00	107.50	1,007.50
峄城区	1,780.00	260.00	2,040.00

台儿庄区	1,440.00	196.00	1,636.00
高新区	40.00	34.50	74.50
市乡村振兴发展中心		1,075.00	1,075.00
合计	9,760.00	3,140.00	12,900.00

### （三）项目计划实施内容

2022年度枣庄市市级乡村振兴衔接资金共涉及6区1市（不含市直）及市乡村振兴发展中心，主要用于人居环境基础设施建设、产业项目、市级公益岗位补助、金融保险等支出。市级财政衔接资金与中央、省财政衔接资金统筹使用，用于支持巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，具体包括以下三个方面：

#### 1.支持巩固拓展脱贫攻坚成果

（1）健全防止返贫致贫监测和帮扶机制，加强监测预警，强化及时帮扶，对监测帮扶对象采取有针对性的预防性措施和事后帮扶措施。可安排产业发展、原扶贫项目提质增效、小额信贷和富民生产贷（含省级扶贫龙头企业贷款）贴息、生产经营和劳动技能培训、公益岗位补助等支出。按省委、省政府要求支持实施特惠保险。继续向符合条件的脱贫家庭（含监测帮扶对象）安排“雨露计划”补助。

（2）外出务工脱贫劳动力（含监测帮扶对象）稳定就业，可以对跨省就业的脱贫劳动力适当安排一次性交通补助。采取扶贫车间、生产奖补、劳务补助等方式，促进返乡在乡脱贫劳动力发展产业和就业增收。

(3) 低保、医保、养老保险、残疾人补助、急难救助等综合保障措施，通过原资金渠道支持。监测预警工作经费通过各级部门预算安排。

## 2.支持衔接推进乡村振兴

(1) 培育和壮大特色优势产业并逐年提高资金占比，支持农业品种培优、品质提升、品牌打造。推动产销对接和消费帮扶，解决农产品“卖难”问题。支持必要的水、电、路、网、仓储物流等农业生产配套基础设施建设。支持脱贫村发展壮大村级集体经济。

(2) 补齐必要的农村人居环境整治和小型公益性基础设施建设短板。主要包括村内道路、饮水、垃圾清运、生活污水处理等小型公益性生活设施。教育、卫生、养老服务、文化等农村基本公共服务通过原资金渠道支持

(3) 实施少数民族特色产业和民族村发展项目。

3.根据巩固拓展脱贫攻坚成果需要，用于持续提升脱贫村、脱贫户脱贫质量。

### (四) 项目组织管理

2022年枣庄市市级乡村振兴衔接资金由枣庄市财政局、枣庄市乡村振兴局按职责分工共同管理，其中，支持推进乡村振兴衔接工作方面资金由市乡村振兴局负责管理。

枣庄市财政局负责专项资金的预算编制、支出政策审核和预算绩效管理，牵头制定专项资金管理办法，不参与专项资金的项

目申报、审批、验收等具体业务。

枣庄市乡村振兴局全面负责本部门预算编制需求和具体执行，制定专项资金分配使用建议，对资金的支出进度、使用绩效以及安全性、规范性负责。根据专项业务工作特点，联合市财政局完善项目库建设，做好项目储备工作，确保专项资金项目全部按规定列入项目库。并按轻重缓急排序，实现项目进度定期更新和滚动管理，未纳入项目库管理的项目不予安排专项资金。项目流程为区（市）乡村振兴局组织各乡（镇）申报项目，申报资料交由市乡村振兴局进行项目评审，针对项目评审通过的项目纳入巩固脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库，由市乡村振兴局按照因素法测算所需资金之后向市财政局提交市级财政衔接资金分配建议的函，市财政局将资金拨付至区（市）财政局，区（市）财政局拨付区（市）乡村振兴局或农业农村局，再由区（市）乡村振兴局拨付至施工单位或者乡（镇）乡村振兴办。

## 二、项目绩效目标

### （一）总体绩效目标

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，全面落实中央农村工作会议和中央1号文件精神，推进乡村产业发展特别是产业扶贫、推进美丽乡村建设特别是农村人居环境整治、基础设施提质改造，集中资源、强化保障，精准施策，加快补齐发展短板，促进农业高质量发展，实现农民高品质生活，推动乡村全面振兴，提升居民幸



福感、归宿感和满意度，彰显魅力乡村建设新形象、新魅力，促进生态文明乡村的建设进程，发挥资金的整体效益，刺激带动当地经济发展。

## （二）2022年度绩效目标

严格落实资金拨付使用时限要求，保障资金用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接各项任务；预算执行率达100.00%，资金分配结果100.00%全额公告；年初项目库共入库项目494项，按项目紧迫性从巩固脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库中选择2022年市级乡村振兴衔接资金实施项目，有序推进项目建设，使得项目按时保质保量完成，项目（工程）完成合格率达100.00%；各项目全过程及时录入防返贫系统，所有项目实施过程的必需环节进行全面公示公告；对于全国12317防止返贫监测和乡村振兴咨询服务平台实现零反馈问题；着力加强项目资金监管，有效改善脱贫享受政策人员生活环境，拉动周边就业，提高经济收入。

## 三、评价基本情况

### （一）评价目的

本次绩效评价的目的是对2022年度枣庄市市级乡村振兴衔接资金的执行情况、资金的使用情况、项目的绩效情况进行综合分析，与预期绩效目标进行对比，总结枣庄市市级乡村振兴衔接资金实施的成绩与经验，揭示存在的问题与不足，在此基础上进一步优化资金使用、完善资金管理、为资金下一步的预算安排提

供参考，提高资金的使用效益。

## （二）评价对象与范围

本次评价对象为2022年度枣庄市市级乡村振兴衔接资金12,900.00万元的使用绩效，评价基准日为2022年12月31日。资金评价的范围共涉及7个区（市）及市乡村振兴发展中心。具体情况详见表4。

表4 各区市资金分类明细表

单位：万元

序号	区（市）	市级公益岗位补助资金	衔接资金切块	金融保险	重点帮扶镇	衔接推进区	市派第一书记帮包村	少数民族发展资金	合计
1	山亭区	330.00	32.00		1,200.00	900.00	720.00	60.00	3,242.00
2	滕州市	900.00	23.00			500.00	960.00		2,383.00
3	薛城区	168.00	14.00		300.00	200.00	760.00		1,442.00
4	市中区	97.50	10.00			500.00	400.00		1,007.50
5	峯城区	240.00	20.00		900.00	200.00	680.00		2,040.00
6	台儿庄区	180.00	16.00		600.00	200.00	600.00	40.00	1,636.00
7	高新区	34.50					40.00		74.50
8	市乡村振兴发展中心			1,075.00					1,075.00
合计		1,950.00	115.00	1,075.00	3,000.00	2,500.00	4,160.00	100.00	12,900.00

注：市派第一书记帮包村资金按照两年度一共40万元的标

准给予市派第一书记帮扶村一次性支持。

### （三）评价依据

- 1.《中华人民共和国预算法》；
- 2.《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）；
- 3.《中共中央 国务院关于实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的意见》（中发〔2020〕30号）；
- 4.财政部关于印发《关于推进预算绩效管理指导意见》（财预〔2011〕416号）；
- 5.财政部关于印发《项目支出绩效评价管理办法》的通知（财预〔2020〕10号）；
- 6.中注协关于印发《会计师事务所财政支出绩效评价业务指引》的通知（会协〔2016〕10号）；
- 7.中共山东省委 山东省人民政府关于《全面推进预算绩效管理的实施意见》（鲁发〔2019〕2号）；
- 8.山东省财政厅 山东省乡村振兴局等5部门关于印发《山东省财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》的通知（鲁财农〔2021〕25号）；
- 9.枣庄市财政局关于《配合做好市财政重点支出项目绩效评价工作》的通知（枣财绩〔2023〕6号）；
- 10.《山东省人民政府关于进一步深化预算管理制度改革的实施意见》（鲁政发〔2021〕19号）；

11.《枣庄市市级部门单位预算绩效管理办法》；

12.枣庄市财政局 枣庄市乡村振兴局 枣庄市民族宗教局关于印发《枣庄市财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》的通知（枣财建〔2021〕13号）；

13.国家相关法律法规和财务会计制度。

#### （四）评价原则、评价方法

##### 1.评价原则

评价过程中主要遵循科学规范、绩效相关、公开透明、激励约束四个关键原则，同时评价工作小组还会针对不同的项目资金，选择适当的工作方法，包括但不限于核查财务资料、项目组织实施资料、项目绩效资料，查看项目现场，数据分析复核，组织开展座谈或问卷调查等方法，并进行实地核查。

##### 2.评价方法

绩效评价过程包括非现场评价、现场评价、综合分析确定评价结果等阶段。非现场评价阶段，在搜集所有项目实施单位相关文件资料的基础上，对资料进行全面整理分析，并采用得分制的方法对各项目实施单位进行打分。现场评价阶段，组织相关人员深入项目点，听取项目实施单位对项目实施的情况介绍，通过实地检查、资料核实、调查问卷等方式，核实了解项目情况，并对照绩效目标和评价指标及标准，对项目实施单位的投入、过程、产出和效果等方面进行分析评价打分。综合分析评价阶段，对现场评价和非现场评价结果进行交叉比对，运用对比分析法，得出

现场评价和非现场评价的得分权重，之后按照各项目的资金规模进行加权，得出项目资金绩效综合评分。

评价的方法主要包括文献资料法、比较分析法、因素分析法、现场调研法和公众评判法。具体为：

(1) 文献资料法。收集、整理与项目相关的政策文件、规章制度，梳理本项目相关的制度资料。本次绩效评价主要对以下两个方面的政策制度进行分析：一是有关国家、省、市政府对本项目制定的相关法律、法规及行政规章、规范性文件；二是山东省政府及主管部门制定的管理办法及实施方案。

(2) 比较分析法。通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、相同部分和相同地区的各类支出，综合分析绩效目标实现程度。

(3) 因素分析法。通过对影响乡村振兴衔接资金项目绩效目标实现以及实施效果的内外因素的综合分析，评价绩效目标的实现程度。一方面从项目实施过程分析项目管理成效，另一方面从项目后续管护分析项目可持续影响等。

(4) 现场调研法。为保证绩效评价数据的完整性，此次评价对本项目进行现场座谈，一方面对项目的档案资料进行现场核查和问询，保证原始数据的真实性；另一方面对乡村振兴衔接资金投入建设具体项目深入了解，进一步核实本项目的规范程度和完成质量，确保评价结果的客观性。

(5) 公众评判法。通过乡村振兴衔接资金投入服务对象进

行问卷调查及抽样调查等对乡村振兴衔接资金支出的效果进行评判，评价绩效目标的实现程度。

### （五）绩效评价指标体系

我们承接该绩效评价项目后，首先与财政部门和项目主管部门沟通，之后根据《中共中央 国务院关于实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的意见》（中发〔2020〕30号）、山东省财政厅 山东省乡村振兴局等5部门《关于印发〈山东省财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法〉的通知》（鲁财农〔2021〕25号）、枣庄市财政局 枣庄市乡村振兴局 枣庄市民族宗教局《关于印发〈枣庄市财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法〉的通知》（枣财建〔2021〕13号）等有关规定，同时结合枣庄市乡村振兴衔接资金实施项目的实际情况，有针对性的设计了绩效评价指标体系。

在指标体系中我们设计了决策（15分）、过程（25分）、产出（30分）、效益（30分）四个一级指标。

决策指标主要是通过项目立项、绩效目标、资金投入三个方面来评价项目立项决策的优劣，其中项目立项通过项目立项政策相符性、项目申报批复程序规范性来评价。绩效目标方面，主要针对绩效目标的合理性以及明确性进行评价。资金投入方面评价预算编制的科学性、资金分配合理性。

过程指标分为资金管理和组织实施两个部分，资金管理从专项资金的到位率、预算执行率、资金使用合规性方面来评价，同

时从组织协调机制健全性和制度执行有效性方面来评价项目的组织实施情况。

产出方面，从项目的产出数量、产出质量、产出时效以及成本控制来对项目整体情况进行评价。

效益方面，我们根据市级乡村振兴衔接资金的特殊性设置了经济效益、社会效益、生态效益、满意度指标4个指标。经济效益主要是对乡村振兴衔接资金是否带动人均收入的情况、产业项目提升社会经济发展情况进行评价。社会效益主要是对项目带动就业人数，带动产业升级、产业集聚，金融保险项目实现应保尽保有效减轻项目损失情况方面进行评价。生态效益主要从生态环境、村容村貌改善情况方面进行评价。满意度指标通过调查受益群众满意度来评价项目实施对受益群众产生的积极或消极影响。

#### （六）评价人员组成

为了较好地完成本次绩效评价工作，本次评价安排了5人全程参与评价工作。人员名单及职责分工情况见表5。

表5 评价工作组人员及分工表

序号	姓名	单位	专业	技术职称	分工
1	刘圣英	山东山审会计师事务所	会计学	注册会计师	项目技术负责人
2	魏亮	山东山审会计师事务所	会计学	注册会计师	主评人
3	胡新宇	山东山审会计师事务所	会计学	会计师	评价组负责人
4	侯小焕	山东山审会计师事务所	会计学	注册会计师	项目组成员
5	肖玉玉	山东山审会计师事务所	会计学	会计师	项目组成员

## （七）绩效评价工作过程

### 1.前期准备阶段

我们与市财政局、市乡村振兴局相关科室进行充分的沟通，收集整理项目资料，对项目的发展规划、总体绩效目标、资金流向、组织架构、管理流程、实施内容进行了解，有针对性的制定实施方案。

### 2.组织实施阶段

一是审核项目实施资料和资金使用资料。对项目进行进一步的了解，对收集的各项项目资料进行分类汇总和审核，并对现场评价中发现的问题进行小组讨论和记录；二是召开座谈会，通过座谈会的方式与相关科室的领导、财务人员等进行交流，听取各方人员对乡村振兴衔接资金项目的陈述与分析，总结项目实施成果和存在的不足，并针对项目实施情况及预算资金支出提出问题，及时与相关科室进行有效沟通、洽谈，听取意见和建议，从而为后面进行绩效评价和撰写绩效评价报告奠定坚实的基础；三是现场勘查，前往项目现场勘查，查看项目产出及绩效情况，核实项目实施质量及效果，使绩效评价量化指标更充分，也确保绩效评价与项目的衔接度更高。

### 3.分析评价阶段

#### （1）数据整理分析

对所收集到的资料、数据进行整理分析。首先将收集到的资料、数据根据评价分析的要求进行简单汇总，然后对评价资料进



行多轮复核，逻辑查错、清理、分类，形成评价个性资料库。

## (2) 赋值打分及结果分析

资料整理分析后，根据评价资料库、指标体系进行打分，之后讨论形成绩效评价分析结果、评价结论、主要经验及做法、存在的问题和建议。

## 4.报告撰写阶段

(1) 依据综合评价结果，按照规定要求和文本格式撰写评价报告，形成报告初稿后，在内部进行三轮的复核及修改，最终形成绩效评价报告初稿。

(2) 征询枣庄市财政局、枣庄市乡村振兴局的意见。

(3) 修改和完善后形成报告终稿在规定时间内提交报告。

## 四、评价结论和分析

### (一) 综合评价结论

经综合评价，2022年度枣庄市市级乡村振兴衔接资金项目绩效评价得分为88.00分，评价等级为“良”，一级指标得分情况明细见表6。

表6 一级指标得分情况明细表

指标	决策	过程	产出	效益	合计
分值	15	25	30	30	100
得分	13.00	21.50	28.00	25.50	88.00
得分率(%)	86.67	86.00	93.33	85.00	88.00

决策方面，项目立项依据充分、具体程序规范，在绩效管理

方面各个区(市)根据具体项目制定绩效目标,但存在部分区(市)项目缺少产出指标,效益指标量化程度不足的情况,不便于后期对项目的相关效益进行评价。

过程方面,财务、业务管理制度健全,各项目主管单位建立了长效机制,预算资金 12,900.00 万元全部拨付至各区(市),各区(市)实际支出金额为 12,889.83 万元,2022 年结余资金 10.17 万元,预算执行率为 99.92%,结余部分为项目审计后审减结余,由财政收回,制度执行较为有效,但存在部分区(市)在收到市级资金后未在 30 日内向区(市)项目实施单位或项目实施主管部门下达补助资金、政府采购程序不合规、项目过程性资料留存不足的情况。

产出方面,各区(市)均能按年度建设计划完成项目建设,成本控制率情况较好,但存在部分项目未按合同约定时间完工的情况。

效益方面,该项目一定程度上带动周边群众就业,促进经济发展,增加村集体收益,从而拉动人均收入增长;人居环境不断改善,幸福感提升。但也存在部分项目截至评价日仍未投入使用,项目未及时产生效益的情况,同时二三产业的人才培养及引进有待进一步加强,各区(市)现阶段建设过程中对于财政资金的依赖程度较高,自筹资金及社会资本较少,对社会资本的吸引力有限。

## 五、绩效评价指标分析

### （一）项目决策情况

该指标分值 15 分，评价得分 13.00 分，得分率 86.67%。项目决策二级指标得分率情况如图 1 所示。

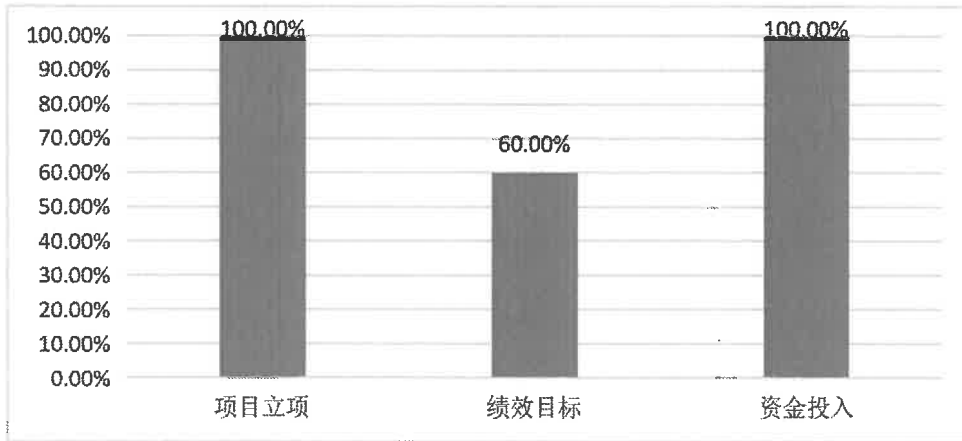


图 1 项目决策二级指标得分率情况

评价认为，该项目立项程序比较完备，资金分配较为合理，但存在绩效指标值完整性欠佳，细化、量化程度不足的情况。

#### 1.项目立项

主要评价立项依据的充分性和具体程序的规范性。

该二级指标分值 4 分，评价得分 4 分，得分率 100%。该项目根据国务院、山东省和枣庄市的文件开展，立项符合相关法律法规与政策要求，在项目立项上紧扣乡村振兴、巩固脱贫攻坚成果的主题，符合巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的发展规划，项目立项依据较为充分，立项程序比较规范。

#### 2.绩效目标

主要评价绩效目标的合理性和绩效指标的明确性。

该指标分值 5 分，评价得分 3 分，得分率 60.00%。部门确

定衔接资金具体项目后，对衔接资金项目绩效目标指标进行了合理设定，衔接资金绩效目标表述形式符合要求、主要内容齐全、文字描述清晰准确，绩效目标体现项目资金的主要功能属性、涵盖项目资金支出主要内容、全面体现预期绩效，绩效目标与项目预算投资额相匹配，绩效指标能够有效支撑绩效目标，归类合理，但存在绩效目标产出和效益方面细化、量化程度上不足，如：2022年度滕州市木石镇独前村枣庄市派第一书记基础设施建设项目-成本指标-价格-合理、社会效益指标-群众生活质量-提高；张汪镇五所楼村基础设施建设项目-截至 2022 年底资金预算执行率未填写。部分项目绩效目标只有效益指标和满意度指标，绩效指标不完整，如：柴胡店镇衔接乡村振兴集中推进区人居环境整治及基础设施建设项目、2022 年度滕州市南胡楼村枣庄市派第一书记基础设施建设项目等无数量指标，不便于后期对项目的相关建设情况进行评价。

### 3.资金投入

主要评价预算编制的科学性和资金分配的合理性。

该指标分值 6 分，评价得分 6 分，得分率 100%。评价认为，枣庄市各区（市）及市乡村振兴发展中心均按照预算要求编制项目预算，资金分配按照因素法进行测算，因素和权重为：相关人群数量及结构 30%、相关人群收入 20%、相关人均财力 10%、政策因素 30%、绩效等考核结果 10%，并进行综合平衡。每年分配资金选择的具体因素和权重，根据当年巩固拓展脱贫攻坚成

果同乡村振兴有效衔接的工作重点进行适当调整。由枣庄市乡村振兴局向枣庄市财政局提出资金分配建议，市乡村振兴局根据各区（市）项目数量及项目大小进行分配，资金测算均有依据，预算编制和资金分配依据充分、科学合理。2022年度枣庄市市级财政衔接资金中93.26%的资金投向基础设施、产业类项目及产业项目资产和收益双保险保费，6.74%的资金投向乡村公益岗及脱贫享受政策和防止返贫监测帮扶对象意外伤害保险。

## （二）项目过程情况

该指标分值25分，评价得分21.50分，得分率86.00%。项目过程二级指标得分率情况如图2所示。

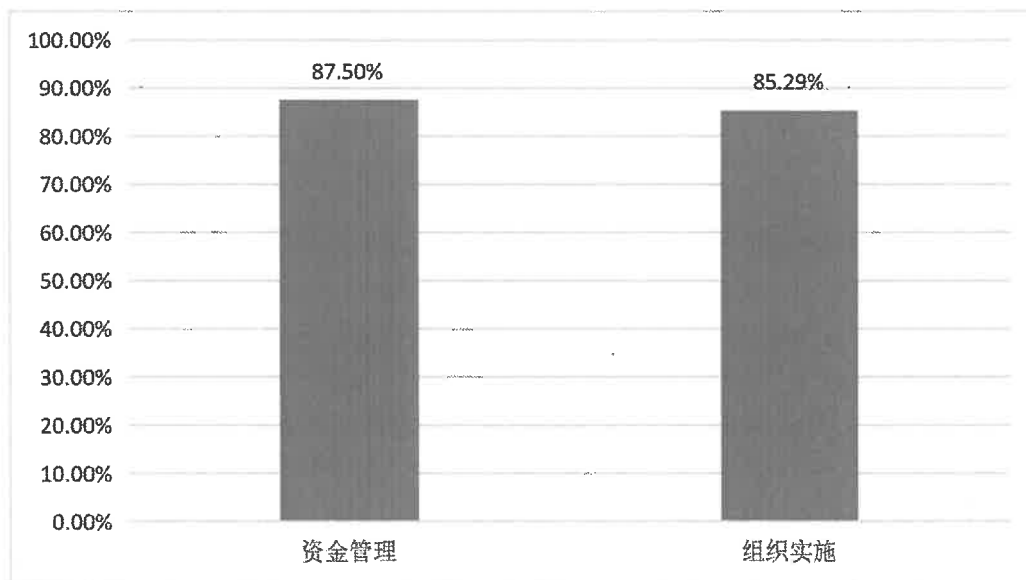


图2 项目过程二级指标得分率情况

在项目资金管理方面，资金的申请、审核、拨付程序较规范，资金使用用途规范，资金到位比较及时，市级财政资金到位率为100%。但存在部分区（市）在收到市级资金后未在30日内向区（市）项目实施单位或项目实施主管部门下达补助资金的情况。

在组织实施方面，各区（市）建立了有关财务、业务管理制度，审批流程规范，公示公告完整、及时，不定期开展核查监督工作，成立专班负责的工作制度进行项目后续管护，确保每个镇街有项目工作专班，但部分项目在档案管理方面缺少项目过程性资料，不利于各部门对项目过程的监管，政府采购程序履行不当。

### 1.资金管理

该指标分值 8 分，评价得分 7 分，得分率 87.50%，资金管理三级指标得分率见图 3。

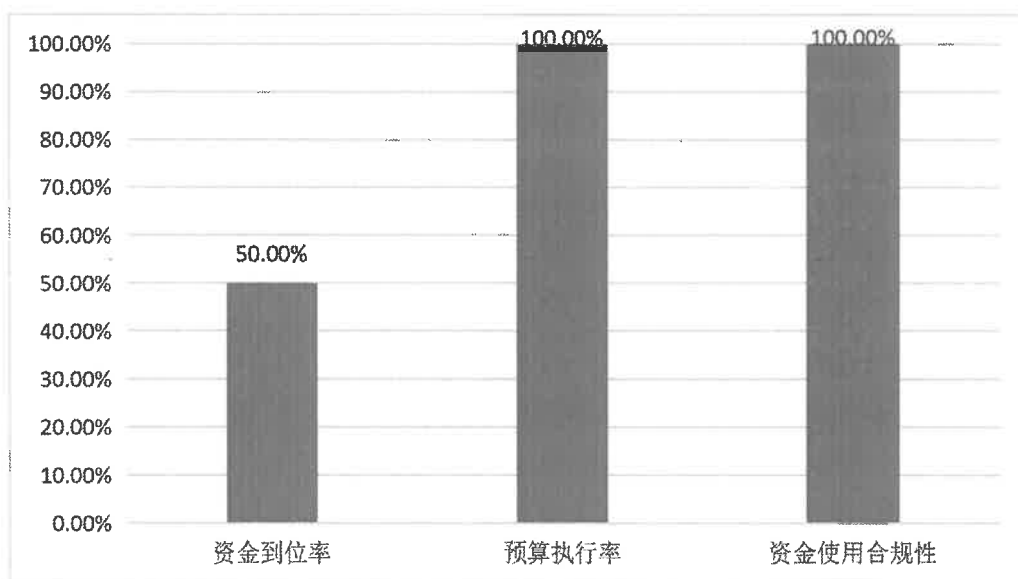


图 3 资金管理三级指标得分率情况

#### (1) 资金到位率

该指标分值 2 分，得分 1 分，得分率 50.00%。此指标考核市级资金到位情况。枣庄市财政局《关于下达 2022 年乡村振兴重大专项资金(市财政补助)预算指标的通知》(枣财农整指(2022)13 号)文件时间为 2022 年 4 月 19 日，枣庄市财政局《关于下达 2022 年乡村振兴重大专项资金(市财政补助)预算指标的通知》

（枣财农整指〔2022〕24号）文件时间为2022年5月26日。截至评价基准日2022年12月31日，各区（市）市级资金均全额到位，到位率100%。但部分区（市）在收到市级资金后未在30日内向区（市）项目实施单位或项目实施主管部门下达补助资金，各单位具体下达时间详见表7。

表7 指标下达时间明细表

区（市）	对应（枣财农整指〔2022〕13号）下达资金时间	对应（枣财农整指〔2022〕24号）下达资金时间
滕州市	2022年4月26日	2022年6月26日
薛城区	2022年5月12日	2022年5月31日
山亭区	2022年4月26日	2022年6月2日
市中区	2022年6月8日	2022年8月31日
峰城区	2022年4月25日	2022年6月1日
台儿庄区	2022年5月27日	2022年6月13日
高新区	2022年4月26日	2022年7月21日

## （2）预算执行率

该指标分值2分，得分2分，得分率100%。此指标考核实施单位的预算执行情况。2022年预算资金12,900.00万元，全部拨付至各区（市），各区（市）实际支出金额为12,889.83万元，2022年结余资金10.17万元，预算执行率为99.92%，结余部分为项目审计后审减结余，由财政收回。具体预算执行情况详见表8。

表 8 预算执行明细表

单位：万元

区（市）	市级预算资金（万元）	实际支出资金（万元）	结余资金（万元）
滕州市	2,383.00	2,383.00	
薛城区	1,442.00	1,442.00	
山亭区	3,242.00	3,231.83	10.17
市中区	1,007.50	1,007.50	
峰城区	2,040.00	2,040.00	
台儿庄区	1,636.00	1,636.00	
高新区	74.50	74.50	
市乡村振兴发展中心	1,075.00	1,075.00	
合计	12,900.00	12,889.83	10.17

### （3）资金使用合规性

该指标分值 4 分，得分 4 分，得分率 100.00%。

①资金使用合规性得分 2 分，得分率 100.00%。通过查看各区（市）提供的财务资料，各区（市）基本能够按照专项资金的使用范围使用资金，财务管理较为健全，资金拨付均履行了申请-审批-支付的程序。

②资金拨付合规性得分 2 分，得分率 100.00%。通过查看各区（市）提供的财务资料及对现场评价点的财务核查，资金支付时，乡镇经办机构提交建设项目进度款申请单、资金拨付审批表，工程量确认单等资料，由区（市）乡村振兴局或乡镇经管站向施工单位进行付款，审批程序和手续完整，2022 年实际到位资金



12,900.00 万元，实际支付资金 12,900.00 万元，预算执行率 100.00%。

## 2.组织实施

对管理制度的健全性及制度执行的有效性进行评价。

该指标分值 17 分，评价得分 14.50 分，得分率 85.29%。组织实施三级指标见图 4。

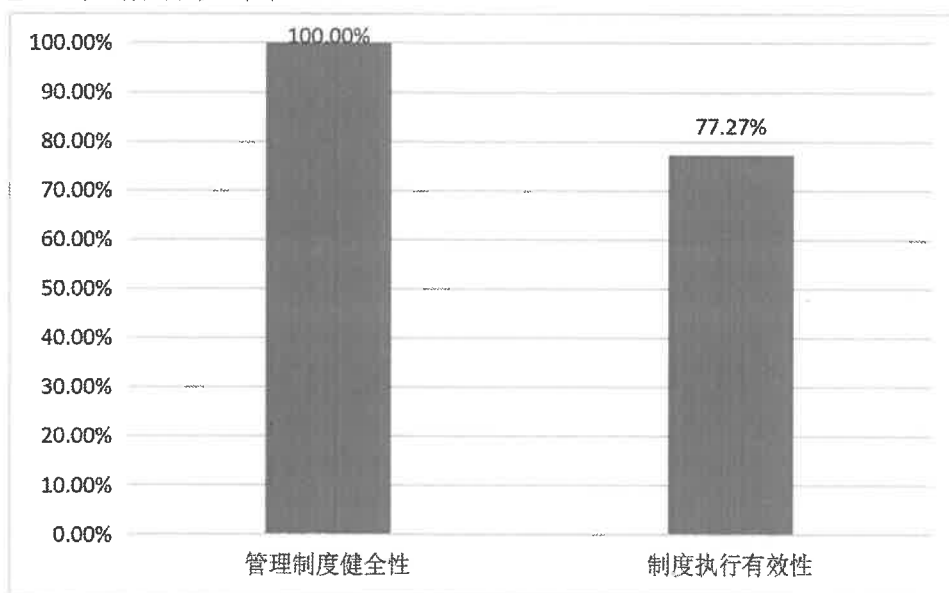


图 4 组织实施三级指标得分率

### (1) 管理制度健全性

该三级指标分值 6 分，评价得分 6 分，得分率 100.00%。

①业务管理制度的健全性得分 3 分，得分率 100.00%。评价认为，各区（市）乡村振兴局根据《山东省财政衔接推进乡村振兴补助资金项目管理办法》（鲁乡振发〔2021〕2号）建立项目资金管理实施细则。项目实施单位成立专班负责的工作制度进行项目后续管护，确保每个镇街有项目工作专班。

②业务管理制度的合规合法性得分 3 分，得分率 100.00%。

此项指标考核实施单位制定的业务管理制度的合法合规性。全市各区（市）制定的业务管理制度均合法合规。

## （2）制度执行有效性

该三级指标分值 11 分，评价得分 8.50 分，得分率 77.27%。各具体评价内容见图 5。

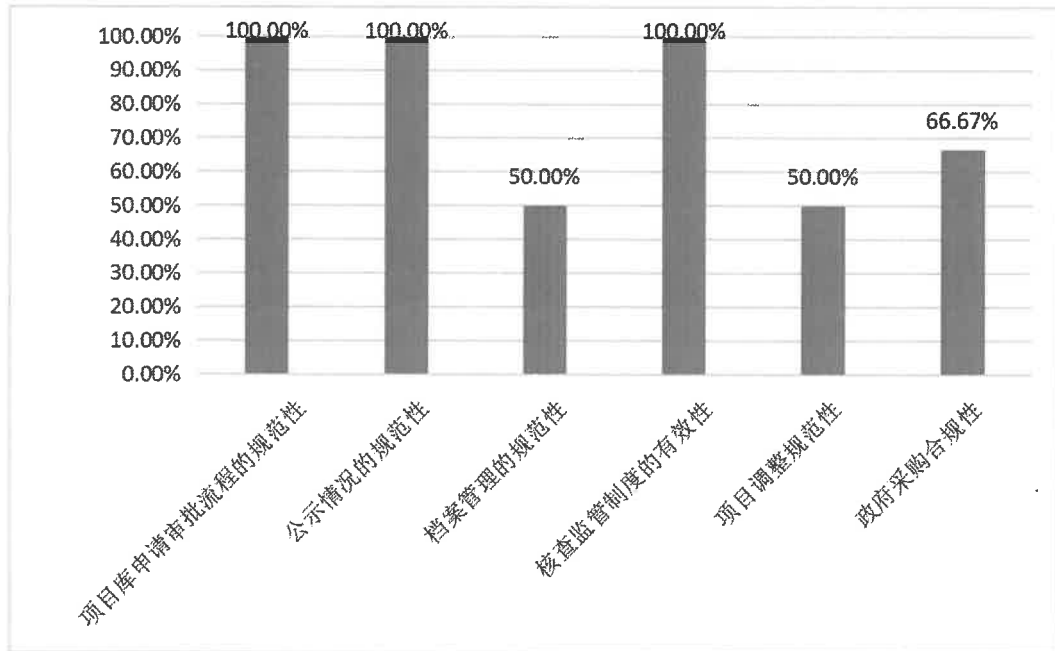


图 5 制度执行有效性具体评价内容得分率

①申请审批流程的规范性得分 2 分，得分率 100.00%。各区（市）先由各村召开拟申报入库项目和项目实施方案会议，经会议研究同意后进行公示，公示无异议后召开乡镇拟申报入库项目和审核项目实施方案会议，会议通过后，由乡镇政府向区（市）乡村振兴局报送申报纳入巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库项目表、申请书及实施方案，区（市）乡村振兴局组织专家对申报入库项目及项目实施方案进行评审，评审专家对申报入库

项目提出论证意见后，区（市）乡村振兴局对衔接资金项目实施方案进行批复且对拟纳入2022年度全区（市）巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库项目清单在区（市）政府网站上进行公示，同时乡镇政府对批复结果进行公告。抽查区（市）项目审批流程规范，公示、公告完整。

②公示情况的规范性得分2分，得分率100.00%。衔接资金项目村级公示公告地点为村级信息公开栏，乡级公示公告地点为乡级政府信息公开栏或乡级政府网站，区（市）级公示公告地点为区（市）级政府门户网站。在信息公开栏进行公示公告的，公示时间不少于5天，公告时间不少于10天；在网站进行公示公告的，公示时间不少于5天，公告时间为长期。项目施工情况现场公告地点为施工现场，公告时间与施工时间同步。抽查项目公示公告完整、规范。

③档案管理的规范性得分1分，得分率50.00%。通过查看各区（市）相关资料及现场抽看，各区（市）档案归档较为及时，但存在较多项目未留存施工日志、监理日志等施工过程性资料，如薛城区周营镇巩湖村现代农业产业园二期项目、山亭区徐庄镇青年回乡创业园电商服务中心设备安装及配套工程、峰城区2022年度古邵镇朱园村现代农业示范园二期项目、2022年度滕州市官桥镇道路硬化建设项目等项目。

④核查监管制度的有效性得分1分，得分率100.00%。抽查的区（市）乡村振兴局均在项目实施过程中对项目实施情况进行

跟踪监督、督导检查，项目实施主体建立后续管护机制，成立项目管理专班，对验收后的项目进行后续管护。

⑤项目调整规范性得分 0.50 分，得分率 50.00%。项目基本按照实施方案申报项目并开展项目建设，建设过程中项目调整能够按规定程序进行申报和审批并与施工单位签订补充协议，但通过查看各区（市）相关资料及现场抽看，存在项目延期完成且未签补充协议或延期申请的情况，如：2022 年度古邵镇朱园村现代农业示范园二期项目延迟完工 3 个月；山亭区 2022 年度北庄镇农产品电子商务服务中心合同约定 2022 年 11 月 30 日前完工，截至现场评价日正在进行内部装修中。

⑥政府采购的合规性得分 2 分，得分率 66.67%。通过查看各区（市）提供的招投标资料，招标程序较符合招标法的相关规定，但个别项目采购程序履行不当，如峰城区古邵镇朱园村现代农业示范园二期项目招标人委托第三方通过非政府网站“中国招标投标公共服务平台”发布招标公告，未通过中国政府采购网、山东政府采购信息公开平台等进行招标公告。

### （三）项目产出情况

该指标分值 30 分，评价得分 28.00 分，得分率 93.33%。项目产出二级指标得分率情况如图 6 所示。

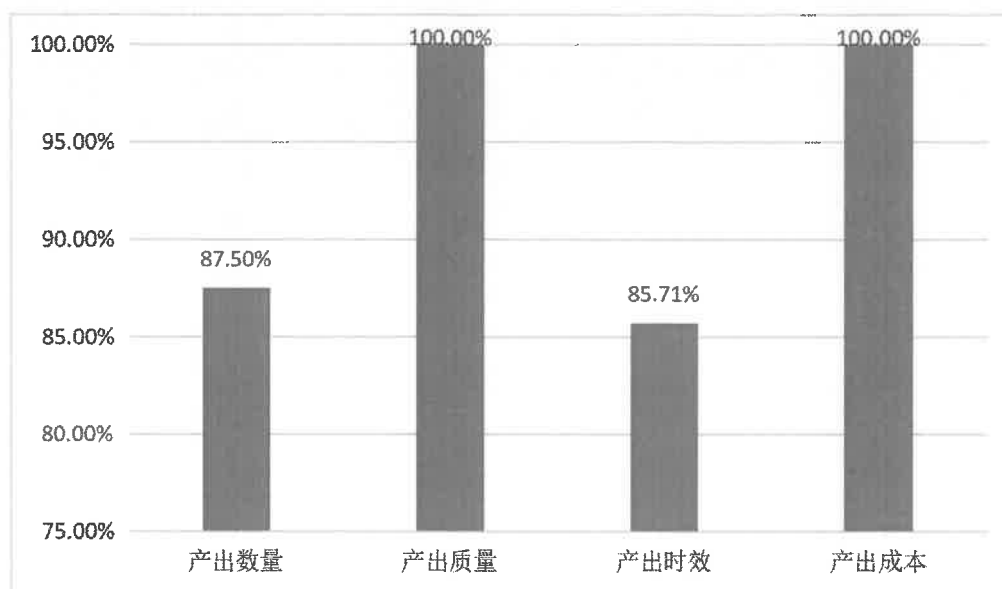


图6 项目产出二级指标得分率情况

项目在产出方面，截至2022年12月31日，2022年年初计划项目建设任务均已实施，实际完成项目与年初计划项目建设任务较为相符，已完工项目均已完成验收，产出成本通过政府采购等方式得到有效控制，但部分项目未按合同约定时间完工，产出及时性欠佳。

### 1.产出数量

对项目建设实际完成程度进行评价。该二级指标分值8分，得分7分，得分率87.50%。2022年年初计划项目建设任务均已实施，基础设施、产业项目类年初计划实施项目数量为164个，实际完成数量为163个，各项目具体实施内容详见附件3问题清单-项目产出明细，人员补助类项目详见附件3问题清单-人员补助明细。实际完成项目与年初计划项目建设任务相符，但存在截至评价日，项目未建设完毕的情况，如山亭区2022年度北庄镇

农产品电子商务服务中心项目，受疫情影响，截至评价日正在内部装修中。通过调查问卷分析，基础设施建设需求排名前三的为文化活动场所、健身器材和排污或排水管道。各区（市）具体产出数量见表9，各区（市）公益岗等人员补助情况见表10。

表9 项目产出数量明细表

单位：个、万元

区（市）	项目类型	计划项目建设数量	本年实际完成项目数量	金额
峯城区	基础设施建设	5	5	440.00
	产业项目	3	3	1545.74
	项目管理费			20.00
薛城区	基础设施建设	18	18	710.00
	产业项目	5	5	717.00
滕州市	基础设施建设	40	40	1770.50
	产业项目	6	6	510.00
	项目管理费			23.00
市中区	基础设施建设	1	1	40.00
	产业项目	13	13	940.00
	项目管理费			5.00
山亭区	基础设施建设	29	29	1,307.00
	产业项目	8	7	1,573.00

	项目管理费			32.00
高新区	基础设施建设	1	1	25.05
	产业项目	1	1	40.00
台儿庄区	基础设施建设	26	26	832.30
	产业项目	8	8	762.86
	项目管理费			16.00
市乡村振兴发展中心	产业项目资产和收益双保险保费			720.70
合计		164	163	12,030.15

表 10 人员补助情况明细表

单位：人、万元

区（市）	项目类型	金额	人数
薛城区	乡村公益岗	15.00	100
峄城区	乡村公益岗	34.26	228
滕州市	乡村公益岗	79.50	530
台儿庄区	乡村公益岗	24.84	166
市中区	乡村公益岗	22.50	150
山亭区	乡村公益岗	330.00	2200
高新区	乡村公益岗	9.45	63
市乡村振兴发展中心	衔接乡村振兴相关保险	354.30	663

合计		869.85	4100
----	--	--------	------

市派第一书记帮包村资金各区（市）使用方向有所差异，市中区主要投向为产业类项目（种植大棚、养殖产业合作社、加工车间等）；山亭区主要投向为基础设施建设（道路硬化），少部分投向光伏发电项目；台儿庄区主要投向为基础设施建设（道路硬化、修缮下水道、新建自来水管道路等），少部分投向蔬菜大棚建设项目；滕州市主要投向为基础设施建设（道路硬化、自来水安装、路灯安装、饮水管网改造、排水设施建设、大口井及灌溉设施建设、开挖排水沟等），少部分投向共建冷库、大棚、钢结构厂房项目；薛城区主要投向为基础设施建设（道路硬化、提升等），少部分投向农贸市场建设项目；峯城区主要投向为基础设施建设（道路硬化、提升等）。

## 2.产出质量

该指标分值 8 分，得分 8 分，得分率 100.00%。项目建设均依据项目实施方案开工建设，项目结束后先由施工单位自行验收，再由乡镇政府向区（市）乡村振兴局提出申请验收报告，最后由区（市）乡村振兴局组织人员进行验收并出具竣工验收报告。经抽查验收报告，部分项目在验收过程中存在质量问题，但施工单位已根据验收结果进行了整改，整改后验收质量合格。

## 3.产出时效

该指标分值 7 分，得分 6 分，得分率 85.71%，主要评价项目实施及时性。各项目整体建设进度与实施方案和合同时间进



度保持一致，但部分项目受疫情及雨季等方面影响施工进度较合同同时限略有滞后，如峰城区 2022 年度古邵镇朱园村现代农业示范园二期项目延迟完工 3 个月，山亭区 2022 年度北庄镇农产品电子商务服务中心合同约定 2022 年 11 月 30 日前完工，截至现场评价日仍未完工。

#### 4.产出成本

主要评价是否存在发放项目金额超预算的情况。该指标分值 7 分，得分 7 分，得分率 100.00%。截至评价基准日，各区（市）2022 年市级乡村振兴衔接资金项目成本控制采用限定招标控制价、政府采购等形式保证了实际成本与工作内容相匹配，并有效控制了工程成本，虽存在调整项目建设内容导致验收时建设成本增加的情况产生，但结算金额未超过合同金额的 5%。

#### （四）项目效益情况

该指标分值 30 分，评价得分 25.50 分，得分率 85.00%。项目效益三级指标得分率情况如图 7 所示。

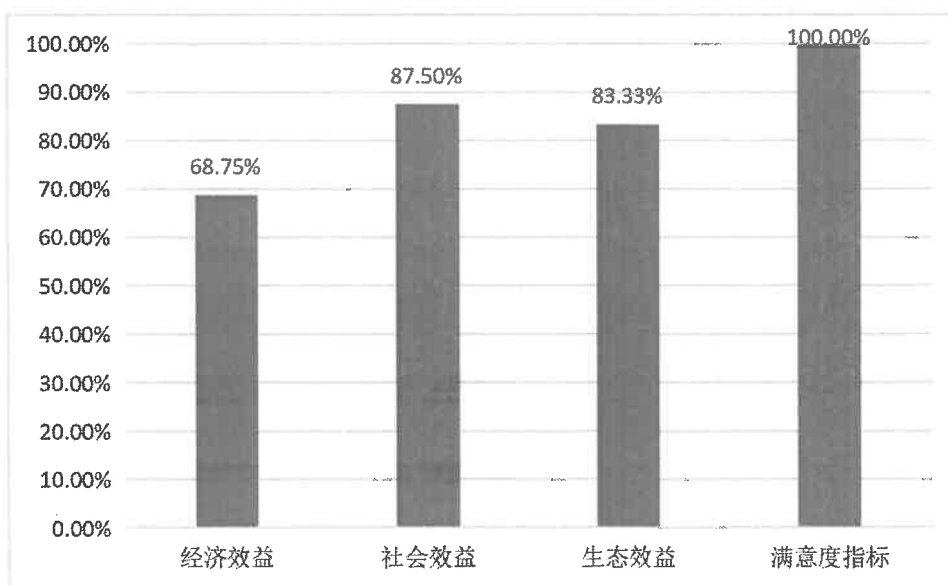


图7 项目效益三级指标得分率情况

效益方面，该项目一定程度上增加周边群众就业，促进经济发展，增加村集体收益，从而拉动人均收入增长；人居环境改善，居民生活环境不断美化，幸福感提升。但也存在部分项目截至评价日仍未投入使用，项目未及时产生效益的情况，同时二三产业的人才培养及引进有待进一步加强，各区（市）现阶段建设过程中对于财政资金的依赖程度较高，自筹资金及社会资本较少，对社会资本的吸引力有限。

### 1.经济效益

主要从乡村振兴衔接资金是否带动人均收入增长的情况和产业项目提升社会经济发展情况进行评价。

该三级指标分值8分，得分5.50分，得分率68.75%。

①乡村振兴衔接资金是否带动人均收入增长的情况得分3.50分，得分率87.50%，脱贫享受政策人口2021年人均收入为11,345.00元，2022年人均收入为13,610.00元，涨幅为19.96%，乡村振兴衔接资金中投入的产业项目一定程度上推动以工代赈，增加周边人口收益来源，拉动人均收入提高。但根据问卷调查，仍有23.95%的群众认为近三年收入提升不明显或没有提升，2.37%的群众近三年收入有所下降。

②产业项目提升社会经济发展情况得分2分，得分率50.00%，2022年度实施的基础设施项目及产业项目共163项，其中产业项目占27.61%，在产业项目中，村集体确权单位与承包单位签订租赁合同，承包单位按合同约定向村集体确权单位支付租赁费

用，从而增加村集体收益，提升周边经济发展。但在现场抽查中，发现存在部分产业项目因疫情及配套设施供应问题未投入使用情况，虽已签订承包协议，但承包单位未进场，从而影响收益的产生时效，如：山亭区2022年徐庄镇青年回乡创业园项目（衔接推进区项目3），滕州市柴胡店镇农旅融合观光木屋合作共建项目（衔接乡村振兴集中推进区产业项目3一批本级）均在2022年12月底前完成验收，承包商预计2023年7月进场。

## 2.社会效益

主要从带动就业人数情况、乡村振兴衔接资金投入项目带动产业升级和产业集聚情况、金融保险项目实现应保尽保和有效减轻项目损失情况三个方面评价政策实施的社会效益。

该三级指标分值8分，得分7分，得分率87.50%。

①带动就业人数情况得分3分，得分率100.00%。枣庄市2021年底脱贫享受政策人口及防止返贫检测对象人口合计70859人，2022年两类人口合计50125人，2022年人口较2021年人口下降29.26%，一定程度上说明乡村振兴衔接资金项目有效拉动就业。

②乡村振兴衔接资金投入项目带动产业升级、产业集聚情况得分2分，得分率66.67%。乡村振兴衔接资金项目在建立农业产业企业保障其农产品供应需求的同时，优化其周边基础配套建设，带动企业投资建设；结合现有景点及民宿等资源特色，统筹开发农业乡村旅游，带动衔接推进区发展，通过建立建设电商平台及新媒体平台，培育新型农业经营主体，边拓宽农产品销售渠

道边引导农户开展农产品精加工，同时冷库提供储存空间，逐步形成标准化、链条化生产，但在二三产业人才培养及人才招引方面有待进一步加强。各区（市）现阶段建设项目更偏向于乡村建设周期短、产出效果好展示的基础设施建设，基础设施项目建设数量占比达到 73.01%，基础设施建设项目中大部分为硬化道路、安装路灯等。项目建设过程中对于财政资金的依赖程度较高，自筹资金及社会资本较少，2022 年度涉及市级资金项目建设总投资 20,400.14 万元，其中财政资金承担 20,279.15 万元，占总投资的 99.41%，对社会资本的吸引力有限。市派第一书记帮包村资金普遍投向于基础设施建设项目，然而基础设施建设项目可整合农村人居环境综合整治（美丽乡村建设）资金进行投入建设，市派第一书记帮包村资金未能够更多的投向产业项目。

③金融保险项目实现应保尽保，有效减轻项目损失情况得分 2 分，得分率 100.00%。市乡村振兴发展中心负责为全市脱贫享受政策人口和防止返贫监测帮扶对象采购意外伤害商业补充保险，为乡村振兴补助资金采购双保险项目（“产业保”“收益保”），2022 年度全市共发生脱贫人口意外伤害 663 件，赔款支出 398.07 万元，“产业保”全年共有案件 37 件，共支付赔款 90.93 万元，“收益保”全年共有 115 个未达到约定收益标准的项目，理赔金额 293.55 万元。金融保险项目实现了应保尽保，有效保障了脱贫享受政策人口和防止返贫监测帮扶对象在保险期内遭受意外伤害导致的残疾和意外伤害医疗费用，充分发挥了保险的风险保障和

经济补偿功能，进一步提升产业项目的抗风险能力，有效助推巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接

### 3.生态效益

主要是评价绿化面积、生态环境提升情况。

该三级指标分值6分，得分5分，得分率83.33%。主要以人居环境提升和道路硬化、亮化为主，通过安装路灯、开挖排水沟、建立垃圾分类亭、种植适合当地生长环境的植物等措施，使得整体村容村貌及相关配套设施得到进一步改善，逐渐形成了村居生态环境一体化，人居生活环境得到进一步优化提升。但在调查问卷中，部分村民反映存在自来水形同虚设，经常发生停水的情况；村内没有公用污水管网，污水基本靠晒干；村内道路两侧乱堆乱放，积水路段较多等情况。

### 4.满意度指标

该三级指标分值8分，得分8分，得分率100.00%。该指标得分情况是根据各区（市）问卷调查结果计算得出，根据问卷调查结果，受益对象对市级乡村振兴衔接资金实施项目的综合满意度为96.72%。

## 六、项目主要经验及做法

### （一）加强项目库建设管理

积极落实党中央、国务院关于实现巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴有效衔接的部署安排，围绕优势特色产业发展、农民群众就近就地就业、多渠道增收等任务，坚持集中连片、突出重点

实施衔接资金项目。按照《关于做好县级巩固拓展脱贫攻坚成果和衔接推进乡村振兴项目库建设管理的通知》（国乡振发〔2021〕3号）的要求，积极谋划2022年巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库，指导区（市）“先建机制、后建项目”，立足自身资源禀赋和区域优势，重点围绕乡村建设、乡村产业发展，因地制宜谋划一批惠长远、效益好、联农带农机制健全的项目。

## （二）积极落实信息公开和公告公示制度

枣庄市严格按照国务院扶贫办 财政部印发《关于完善扶贫资金项目公告公示制度的指导意见》（国开办发〔2018〕11号）和《枣庄市扶贫资金项目公告公示实施细则》（枣扶贫组办字〔2018〕33号）的要求，对2022年以来所有下达的衔接资金的分配结果、项目计划安排情况、项目库建设情况、项目计划安排完成情况在市政府门户网站及时并长期公开，接受大众监督。严格执行项目入库、项目实施、收益使用等方面村、镇、区（市）三级公示公告制度。不定期对区（市）公示公开结果开展抽查，确保公开信息全面及时。

## （三）加强跟踪督促项目实施情况

各区（市）坚持完善专班负责的工作制度，确保每个镇街有项目工作专班、每个项目有管理专班；建立健全项目审核报备工作制度，各区（市）将年度衔接资金项目库、项目实施方案，在区（市）审批前报市局审核，审批后报市局备案；建立“红黄蓝”项目建设预警制度，建立项目建设进度台账，收集项目进展的影

像、照片、报账凭证等资料，实行定期通报推进项目进度，确保重点区域项目建设高质高效。

## 七、存在的问题及原因分析

### （一）个别项目进度滞后，影响项目效益

一是截至评价日，部分完工项目存在验收通过但未投入使用的情况，一定程度上影响项目效益。如山亭区 2022 年徐庄镇青年回乡创业园项目 12 月 29 日山亭区乡村振兴局完成验收；滕州市柴胡店镇农旅融合观光木屋合作共建项目 12 月 26 日滕州市乡村振兴局完成验收，截至评价日，仍未投入使用，主要原因为项目租赁协议尚需商榷，租赁协议签订时间较晚及租赁方个人原因，投入进度缓慢。

二是部分项目未按合同计划时间完成施工，如峰城区 2022 年度古邵镇朱园村现代农业示范园二期项目，该项目计划开工日期为 2022 年 6 月 24 日，计划竣工日期为 2022 年 9 月 22 日，实际竣工日期为 2022 年 11 月 25 日；山亭区 2022 年度北庄镇农产品电子商务服务中心项目，该项目计划开工日期为 2022 年 8 月 18 日，计划竣工日期为 2022 年 11 月 30 日，截至现场评价日尚未竣工。延迟的主要原因为由于新冠肺炎疫情影响，各环节无法正常开展，原定各施工环节延迟；施工过程中遇到汛期，连续降雨导致项目无法正常施工；项目原料需定制且由定制厂家专业人员安装。

### （二）政府采购管理工作不到位，档案管理规范性需进一步

## 加强

一是政府采购程序履行不当，如峰城区古邵镇朱园村现代农业示范园二期项目招标人委托第三方通过非政府网站“中国招标投标公共服务平台”发布招投标文件，未通过中国政府采购网、山东政府采购信息公开平台进行招投标。

二是因施工或监理单位未提供施工日志或监理日志等过程性资料，从而使主管单位缺少监管资料，造成部分项目在验收过程中存在质量问题，项目流程管理需进一步完善。

**（三）大部分实施项目为基础设施建设项目，政策落实效果有待加强**

各区（市）实施项目均偏向于乡村生态环境提升中的基础设施建设项目，基础设施项目建设数量占比达到 73.01%，部分产业效益未充分体现，后续市场化程度难以预计，现有产业项目对于二三产业人才培养及人才招引有待进一步加强，各区（市）现阶段建设过程中对于财政资金的依赖程度较高，自筹资金及社会资本较少，2022 年度涉及市级资金项目建设总投资 20,400.14 万元，其中财政资金承担 20,279.15 万元，占总投资的 99.41%，对社会资本的吸引力有限，综合效益有待进一步加强。

**（四）绩效目标设定不完整，考核工作不到位**

绩效目标设置的产出指标不够完整，效益指标不够细化、量化，不便于后期对项目的相关效益进行评价。



## 八、意见建议

### （一）提高项目投入产出进度，充分发挥资金效益

建议科学规划项目投入产出进度，积极联合各部门加强项目投入使用的推动引导和工作指导，积极推动项目进程，落实项目未实施的具体原因，科学规划重点项目、重点任务及重点工作，明确项目具体责任人员，科学确定并严格执行合理建设工期，加强组织领导，对中期调整事项完善相关调整手续，确保资金支付进度，防范财政资金风险，切实提高财政资金安全管理水平，凝聚提质增效合力，落实责任主体对项目的后续管理及维护，充分发挥资金效益。

### （二）加强政府采购管理，完善项目流程管理

建议各单位加强对各类采购活动的监管，进一步规范采购程序，定期对采购过程和结果进行监督检查。加强对采购商、供应商、评标专家等相关方面的诚信培育和监督，营造公开透明、公正公平的采购市场环境。严格按照《中华人民共和国政府采购法》等相关文件的要求在政府指定网站予以公示。项目单位应加强项目的过程管理，进一步完善项目流程管理，避免出现过程管理不规范的情况，有效对施工过程进行监控，充分发挥财政资金的使用效益。

### （三）改善政策保障机制，项目建设规划立足当前着眼长远

产业发展是摆脱贫困的根本之策，要大力发展特色产业，推进一村一品、一县一业，形成稳定的产业链和供应链，产业规划

和实施需要更大的专业性，同时要求更显著的效益，更需要吸引专业化的社会资本加入。在不形成地方政府隐性债务的前提下，可采用以奖代补、先建后补等方式吸引各类资金支持衔接推进区等建设。整合同类型奖补资金，保障资金投入在政策支持的前提下提高使用匹配程度，对于资源良好、基础实施较好的乡镇，积极探索乡村特色产业，打造村镇产业升级版和经济增长极，带动村集体收益不断提升，对于资源短缺、基础薄弱的乡镇，积极完善基础设施建设，有效增强脱贫致富的内生动力，为巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接创造良好的环境。

#### （四）增强绩效管理意识，做实绩效管理工作

建议部门严谨编制绩效目标，根据预算绩效目标管理办法，进一步细化绩效目标内容，从数量、质量、时效等方面进行分解细化，提高乡村振兴衔接资金项目的管理效率。

附件：1.调查问卷及统计分析表

2.绩效评价得分表

3.问题清单

# 枣庄市 2022 年度乡村振兴市级财政衔接 资金绩效评价调查问卷

## 1.您所在区县[单选题]

选项	小计	比例
薛城区	29	 7.63%
滕州市	33	 8.68%
市中区	7	 1.84%
峯城区	208	 54.74%
台儿庄区	9	 2.37%
山亭区	64	 16.84%
高新区	30	 7.89%
本题有效填写人次	380	

## 2. 您认为近两年村内哪方面变化最大?[多选题]

选项	小计	比例
A、道路便捷通畅	350	 92.11%
B、用水便利	275	 72.37%
C、生态环境提升	304	 80%
E、合作社产业建设增加	174	 45.79%
F、村内照明设施增加	260	 68.42%
G、其他	36	 9.47%
本题有效填写人次	380	

## 3. 您对村内基础设施建设是否满意?[单选题]

选项	小计	比例
A、非常满意	326	 85.79%
B、满意	44	 11.58%
C、一般	10	 2.63%

D、不满意	0	 0%
本题有效填写人次	380	

#### 4. 您对村内道路是否满意? [单选题]

选项	小计	比例
A、非常满意	330	 86.84%
B、比较满意	41	 10.79%
C、一般	9	 2.37%
D、不满意	0	 0%
本题有效填写人次	380	


#### 5. 您希望增加什么样的基础设施?[多选题]




选项	小计	比例
A、路灯	183	 48.16%
B、健身器材	221	 58.16%
C、排污或排水管道	200	 52.63%
D、文化活动场所	234	 61.58%
E、公厕	180	 47.37%
F、垃圾桶数量	145	 38.16%
本题有效填写人次	380	

#### 6. 您认为在公路建设方面有哪些需要提升改善的?[多选题]

选项	小计	比例
A、平整路面	209	 55%
B、扩宽道路	273	 71.84%
C、增加道路两旁绿化	235	 61.84%
D、其他(填空)	9	 2.37%
本题有效填写人次	380	

#### 7. 您对村内这两年人居环境情况是否满意?[单选题]

选项	小计	比例
A、非常满意	325	 85.53%

B、满意	46	 12.11%
C、一般	9	 2.37%
D、不满意	0	 0%
本题有效填写人次	380	

8.您认为村内合作社产业近几年发展情况如何?[单选题]

选项	小计	比例
A、效益很好	228	 60%
B、效益较好	76	 20%
C、一般	32	 8.42%
D、效益不好	1	 0.26%
E、村内无合作社	13	 3.42%
F、不清楚	30	 7.89%
本题有效填写人次	380	

9.您近三年内收入变化情况如何?[单选题]

选项	小计	比例
A、明显提升	280	 73.68%
B、提升不明显	70	 18.42%
C、没有提升	21	 5.53%
D、有所下降	9	 2.37%
本题有效填写人次	380	

10.您认为村内近几年建设存在哪些不足之处?[填空题]



2022年度枣庄市市级乡村振兴衔接资金绩效评价指标体系

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标说明	指标解释	评价标准	分值	得分	扣分原因
项目立项 (4分)	立项依据充分性 (2分)	①项目立项是否符合国家法律法规、国家发展规划和产业政策(0.5分)； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求(0.5分)； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门职责所需(0.5分)； ④项目是否属于公平财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则(0.5分)。	①项目立项是否符合国家法律法规、国家发展规划和产业政策(0.5分)；	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况	该指标分值2分，每不符合指标说明中的一项扣0.5分，扣完为止。	0.50	0.50	
			②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求(0.5分)；					
			③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门职责所需(0.5分)；					
			④项目是否属于公平财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则(0.5分)。					
决策 (15分)	绩效目标合理性 (2分)	①项目按规定程序申请设立，且经过了必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评价(2分)； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性(0.5分)； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平(0.5分)； ④是否与预算确定项目投融资额或资金量相匹配(0.5分)。 ⑤是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标(1.5分)； ⑥绩效指标是否可以通过清晰、可衡量的指标值予以体现，且与项目目标任务数或计划数相对应(1.5分)。	①项目按规定程序申请设立，且经过了必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评价(2分)；	项目申报、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况	该指标分值2分，每不符合指标说明中的一项扣0.5分，扣完为止。	2.00	2.00	
			②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性(0.5分)；					
			③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平(0.5分)；					
			④是否与预算确定项目投融资额或资金量相匹配(0.5分)。					
绩效目标 (15分)	绩效目标合理性 (2分)	①项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平(0.5分)； ②是否与预算确定项目投融资额或资金量相匹配(0.5分)。 ③是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标(1.5分)； ④绩效指标是否可以通过清晰、可衡量的指标值予以体现，且与项目目标任务数或计划数相对应(1.5分)。	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况	项目有绩效目标得0.5分，否则不得分	项目绩效目标与实际工作内容的具有相关性得0.5分，否则不得分。	0.50	0.50	
			②是否与预算确定项目投融资额或资金量相匹配(0.5分)。					
			③是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标(1.5分)；					
			④绩效指标是否可以通过清晰、可衡量的指标值予以体现，且与项目目标任务数或计划数相对应(1.5分)。					
绩效目标 (15分)	绩效指标明确性 (3分)	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标(1.5分)； ②绩效指标是否可以通过清晰、可衡量的指标值予以体现，且与项目目标任务数或计划数相对应(1.5分)。	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明确化情况	预算确定的项目投融资额或资金量相匹配得0.5分，否则不得分。	绩效目标细化程度高得1.5分，一般得0.5分，否则不得分	0.50	0.50	绩效目标不细化，无产出指标
			②绩效指标是否可以通过清晰、可衡量的指标值予以体现，且与项目目标任务数或计划数相对应(1.5分)。					
			③是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标(1.5分)；					
			④绩效指标是否可以通过清晰、可衡量的指标值予以体现，且与项目目标任务数或计划数相对应(1.5分)。					

资金投入 (6分)	预算编制科学性 (3分)	①预算编制依据是否充分(1.5分)； ②预算编制是否科学合理(1.5分)。	项目预算编制是否科学、是否有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况	预算编制依据充分得1.5分，每发现一处不充分的扣0.5分。	1.50	1.50	
	资金分配合理性 (3分)	①预算资金分配依据是否充分(1.5分)； ②资金分配额度是否科学合理(1.5分)。	项目预算资金分配是否有预算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的合理性、科学性	切块资金分配依据充分得1.5分，每发现一处分配依据不充分的扣0.5分、 分配额度科学合理得1.5分，每发现一处分配额度不合理的扣0.5分。	1.50	1.50	
资金管理 (8分)	资金到位率 (2分)	①对市级财政资金使用情况进行评价(到位率=实际到位资金/市级财政资金使用数×100%) 实际到位资金=一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目的资金- 预算资金-一定时期(本年度或项目期)内预算安排到具体项目的资金。 (2分)	对市级财政资金使用情况进行评价	该项分值=资金到位率*指标满分 值2分，指标得分不超过2分。每发现一处超30天 下达资金的扣0.25分。	2.00	2.00	市中区、台儿庄区在收到市级资金后未在30日内向区 (市)项目实施单位或项目实施主管部门下达补助资金
	预算执行率 (2分)	①预算与实际情况的差距是否在合理范围内，预算执行率=(实际支出 资金/实际到位资金)×100%。(2分)。实际支出资金=一定时期(本半 度或项目期)内项目实施拨付的资金。	项目预算资金是否按照计划执行，用以反 映或考核项目预算执行情况	该项分值2分，指标得分=预算执行率*指标满分 值2分，指标得分不超过2分。	2.00	2.00	
	资金使用合规性 (4分)	①资金的用途是否合规(2分)； ②资金拨付是否符合预算的要求，调整是否有完备的手续进行评价(2 分)。	项目资金使用是否符合相关的财务管理 制度规定，用以反映和考核项目资金的 规范运行情况	乡村振兴衔接资金全部用于政策确定的范围得2 分，存在挪用、挤占、虚列支出等情况每 发现一项扣0.5分，扣完为止。 拨付有完善的事报程序和手续不完备的扣0.5分	2.00	2.00	
	管理制度健全性 (6分)	①是否已制定或具有相应的业务管理制度(3分)； ②业务管理制度是否合法、合规、完整(3分)。	项目实施单位的管理制度是否健全，用以 反映和考核业务管理制度等项目的实 施的保障情况	若项目实施单位财务、业务管理制度、后续管护制度 等健全得3分，否则酌情扣分；若项目实施单位未建 立财务、业务管理制度、后续管护制度等，则该 指标得0分。 制度合法、合规、完整得3分，每发现一处不符 合上述要求的扣0.5分	3.00	3.00	



过程 (25分)	组织实施 (17分)	①项目库建设管理、申请入库、申报、评审流程的规范性 (2分)	项目库建设管理、申请入库、申报、评审流程规范性每发现一处不规范的扣1分。	2.00	2.00	
		②公示情况的规范性 (2分)	公示符合相关要求得2分;是否按照政策要求在政府网站上对申报入库、项目库内卷进行公示、公示是否包含单位名称或项目名称,每发现一处不符合要求的扣0.25分,扣完为止。	2.00	2.00	
		③档案管理的规范性 (2分)	档案管理制度得2分,每发现一处不及时时,档案混乱工作的扣0.25分,例如实施方案、项目合同书、验收报告、施工日志、监理日志等资料是否齐全并及时归档,扣完为止。	2.00	1.00	部分项目在项目实施过程性资料,如施工日志、建立日志。
		④核算监管制度的有效性 (1分)	是否对项目实施情况进行督导检查,是否对完工项目进行跟踪督办,严格执行得1分,每发现一处不规范的扣0.5分,扣完为止。	1.00	1.00	
		⑤项目调整规范性 (1分)	该项分值1分。项目实施单位项目调整按照既定程序和权限进行,手续完备,资料齐全得1分,否则不得分。	1.00	0.50	2022年度古都镇朱园村现代农业示范园二期项目延迟完工3个月,山亭区2022年度北庄镇农产品电子商务服务中心合同约定2022年11月30日前完工,截至评价日正在进行内部装修中,无相关补充协议或延期申请等纸质资料
		⑥对项目采购是否经过政府采购程序,符合招标法的相关规定,程序是否合规进行评价 (3分)。	项目采购经过政府采购程序,符合招标法的相关规定,程序合规,未发现违规扣1分。若项目20%以上资金违反区相关规定,则该指标整体不得分。	3.00	2.00	峰城区古都镇朱园村现代农业示范园二期项目招标人委托第三方通过非政府网站“中国招标投标公共服务平台”发布招标公告,未通过中国政府采购网、山东政府采购信息公共服务平台等进行招标公告。
		①项目建设完成率 (8分)	对照实施方案,对项目主要及配套建设完成情况完成率=(实际完成量/计划完成量)×100%,每有一个未完成的项目扣1分。	8.00	7.00	截至评价日,项目未建设完毕的情况,如山亭区2022年度北庄镇农产品电子商务服务中心项目,受疫情影响,截至评价日进行内部装修中。
		②对照实施方案,对项目实施质量达标情况进行评价 (8分)	对于未开工的项目该指标不得分;对于正在施工的项目如符合工程进度符合监理或项目管理人员的要求得满分,监理或项目管理人员每要求施工单位整改一次扣0.2分,扣完为止;对于已完工的项目如专项验收资料非经监理单位审查发现问题8分,经查看项目点存在质量问题的,发现一次扣0.2分,扣完为止。	8.00	8.00	
		①对项目实施的及时性进行评价 (5分)	①对项目实施的及时性进行评价(完成率=(实际完成情况/计划完成情况)×100%)	7.00	6.00	峰城区2022年度古都镇朱园村现代农业示范园二期项目延迟完工,山亭区2022年度北庄镇农产品电子商务服务中心合同约定2022年11月30日前完工,截至评价日进行内部装修中。
		产出 (30分)	产出数量 (8分)	产出质量 (8分)	产出时效 (7分)	



## 2022年度枣庄市市级乡村振兴衔接资金问题清单

问题分类	序号	问题描述
绩效目标存在的问题	1	绩效指标明确性1. 绩效目标申报表绩效指标不完整，指标不细化，量化程度不足，如：柴胡店、鲍沟、张汪等，不便于后期对项目效益进行评价；
资金管理存在的问题	1	资金到位率市中区、台儿庄区收到市级资金预算指标文后未在30日内向区（市）具体项目实施单位或项目实施主管部门下达补助资金
	2	资金使用合规性：政府采购程序履行不当，如峰城区古邵镇朱园村现代农业示范园二期项目招标公告地址为中国招标投标公共服务平台，未在中国政府采购网或者中国山东政府采购网站进行招标公告。
组织实施存在的问题	1	制度执行有效性：部分项目无项目实施过程性资料，如施工日志、监理日志
项目产出存在的问题	1	产出数量：受疫情影响，截至评价日，山亭区2022年度北庄镇农产品电子商务服务中心项目正在进行内部装修中。
	2	产出时效：1、峰城区2022年度古邵镇朱园村现代农业示范园二期项目延迟完工3个月；2、山亭区2022年度北庄镇农产品电子商务服务中心合同约定2022年11月30日前完工，截至评价日进行内部装修中。
项目效益存在的问题	1	经济效益：1、根据问卷调查，仍有23.95%的群众认为近三年收入提升不明显或没有提升，2.37%的群众近三年收入有所下降。2、存在验收完成后未投入使用的项目，影响收益及时性，如：山亭区2022年徐庄镇青年回乡创业园项目（衔接推进区项目3），滕州市柴胡店镇农旅融合观光木屋合作共建项目（衔接乡村振兴集中推进区产业项目3一批本级）。
	2	社会效益：大部分实施项目为基础设施建设项目，对于二三产业人才培养及人才招引有待进一步加强，各区（市）现阶段建设过程中对于财政资金的依赖程度较高，自筹资金及社会资本较少，对社会资本的吸引力有限。
	3	生态效益：调查问卷中，存在部分村民反映自来水但形同虚设，隔三差五停水，村内没有公用污水管网，污水基本靠晒干，村内道路两侧乱堆乱放，积水路段较多等情况。

序号	县区名称	乡镇名称	项目名称	项目基本情况		
				年初计划项目建设任务	中期调整项目建设任务	本年实际完成项目情况
1	高新区	兴城街道	2022年度蒋庄村光伏发电项目	蒋庄村租用兴城社区卫生服务中心办公楼顶光伏发电项目（具体租赁内容以蒋庄村委员会与兴城社区卫生服务中心签订租赁合同约定为准），根据楼顶实际情况预计将建成约108KW的光伏发电设施，主要建设内容包括单元支架安装，太阳能光伏组件铺设，逆变器安装，防雷接地工程安装，电缆敷设串联线，配电系统及其相关的并网接入安装及调试工作等工程建设。		2022年度蒋庄村光伏发电项目位于长白山路与大连路交叉路口南150米，兴城卫生服务中心办公楼楼顶，总装机容量为111.18KW，总投资金额为40万元整，资金来源全部为2022年度衔接推进乡村振兴补助（市派第一书记）资金，主要建设内容包括单元支架安装，太阳能光伏组件铺设，逆变器安装，防雷接地工程安装，电缆敷设串联线，配电系统及其相关的并网接入安装及调试工作等工程建设。
2	高新区	兴仁街道	2022年基础设施建设项目	1.匡山头村：村庄部分道路老化或无硬化，影响居民出行，计划硬化村庄北头道路，东西长305米。2.洪洼村：村庄历史以来处于低洼地段，每到雨季均出现内涝现象，影响居民生产、生活。（1）计划新建洪洼村基本农田南头排水沟渠，长100米，宽0.5米，高0.5米，8立方沉泥池，将积水引至沉泥池沉淀后，排到公共下水道内。（2）村庄洪一路、洪二路、洪三路中段、洪四路中段约400米下水道清淤更换顶盖，同时购置小型排水汽泵两台及1000米抽水管，积极应对雨季排涝工程。3.兴仁村：（1）村庄自来水为自供深井水，位于敬老院东侧高村厂附近的主管道20米年久失修，有跑冒滴漏现象，计划更换埋地3节水管和2个阻停。（2）村内排水沟约100米，有乱倒垃圾现象，每到雨季积水导致污水横流，影响居民生产、生活，计划清淤埋管排水。		1、匡山头村硬化村庄北头道路，东西长 305 米，村通过竞争性磋商由山东德安建设工程有限公司实施工程。2、洪洼村新建洪洼村基本农田南头排水沟渠长约 100 米和 8 立方米沉泥池，村庄下水道清淤约 400 米并更换顶盖顶盖、购置小型排水汽泵两台及 1000 米抽水管。3、兴仁村更换村自来水管普通埋地 3 节水管和 2 个阻停，清淤埋管排水村内排水水 100 米。
3	山亭区	桑村镇	2022年度辛庄村基础设施建设项目	计划对辛庄村村内正文建门口东西巷158*2.6=410.8㎡，阿庆东家东西巷107*2.6=278.2㎡，宝弟西北巷108*2.6=280.8㎡，孟二收粮点后面东西巷182*2.6=473.2㎡，赵允才门前至于立后院150*2.6=390㎡，于秀营到福国庆东西巷145*2.6=377㎡，于秀营至于立前院145*2.6=377㎡，于宝到张成志东院160*2.6=416㎡，其余短街巷9条1510.6㎡，合计4513.6平方米，道路进行硬化，硬化厚度约15cm。		实际完成正文建门口东西巷410平方米，孟二后面东西巷621.76平方米，于立后院路面303.8平方米，于秀营门口硬化377平方米，陈一饭店、王宝堂等34条短街巷硬化2450.17平方米，总计硬化4575.73平方米。
4	山亭区	桑村镇	2022年度艾湖村基础设施建设项目	计划对艾湖村崔加泉至史敬忠段345*3=1035㎡，李家羊汤至刘刘峰段55*4=220㎡，陈玉刚至刘峰段137*4=548平方米，北留路至北大街段282*4=1128㎡，民康庄南至丁行总厂段192*4=768㎡，大街北头至洪玉善厂480平方米进行道路硬化，总计4179㎡，硬化厚度15cm。		实际完成艾湖村崔加泉至史敬忠段道路硬化1035㎡，李家羊汤至刘刘峰段220㎡，陈玉刚至刘峰段548平方米，北留路至北大街段=1128㎡，民康庄南至丁行总厂段768㎡，大街北头至洪玉善厂480.19平方米进行道路硬化，总计4189.19㎡，硬化厚度15cm。
5	山亭区	店子镇	2022年安陵村基础设施建设项目	2022年安陵村基础设施建设项目实施安陵村内道路硬化，宽平均约3.4米，长约1020米，厚度15厘米总面积约3470平方米。计划投资0.015555万元。其中市派第一书记衔接资金40万元，村级自筹0.015555万元。		2022年安陵村基础设施建设项目实际完成新修生产路3466.68平方米，实际投资32.50964万元
6	山亭区	城头镇	2022年度城头镇东村基础设施建设项目	计划铺设柏油村内路面5000平方米	调整为铺设柏油村内路面5570平方米	铺设柏油村内路面5661.69平方米
7	山亭区	城头镇	2022年度城头镇陈湖村基础设施建设项目	计划硬化村内路面厚18cm、5000平方米	调整为硬化村内路面3900平方米	硬化村内路面3848平方米
8	山亭区	凫城镇	2022年凫城镇槐树村基础设施建设项目	槐树村至石门主路长3500米，宽4米。	调整为在槐树村至石门主路铺设柏油路面，沥青混凝土9880平方米，长2470米，宽4米，厚5厘米。水泥石灰碎石（砾）石1320平方米等配套，总预算费用80.520417万元	在槐树村至石门主路铺设柏油路面，5cm厚沥青路面10883.44㎡，分别为：村委会门口共825.44㎡，村委会以东共987㎡，村委会以西400㎡，10cm厚沥青路面62.8㎡，10cm厚混凝土路面150㎡；水泥石灰碎石等配套。
9	山亭区	徐庄镇	徐庄镇2022年水门村乡村振兴第一书记工作代赈基础设施项目	项目实施地点为徐庄镇水门村修建水泥混凝土路面1、北水门小组刘宝军家西至湖湖昌80米、宽3米、厚0.15米计240平方米；2刘红海家门口至庙于北长210米、宽3米、厚0.15米计315平方米；3、中水张显成家西至西河长300米、宽3米、厚0.15米计450平方米；4、王光峰门口至南山长410米、宽3米、厚0.15米计615平方米；5、南水刘春学门口至河边长200米、宽3米、厚0.15米计300平方米；6、李夫家门口至李响岭长300米、宽3米、厚0.15米计450平方米；7、刘海海门口至南山长120米、宽3米、厚0.15米计360平方米，共计修建4650平方米。		项目实施地点为徐庄镇水门村修建水泥混凝土路面1、北水门小组刘宝军家西至湖湖昌80米、宽3米、厚0.15米计240平方米；2刘红海家门口至庙于北长210米、宽3米、厚0.15米计420平方米；3、中水张显成家西至西河长300米、宽3米、厚0.15米计900平方米；4、王光峰门口至南山长410米、宽3米、厚0.15米计1230平方米；5、南水刘春学门口至河边长200米、宽3米、厚0.15米计600平方米；6、李夫家门口至李响岭长300米、宽3米、厚0.15米计900平方米；7、刘海海门口至南山长120米、宽3米、厚0.15米计360平方米，共计修建4650平方米。
10	山亭区	徐庄镇	徐庄镇王庄村分布式光伏发电项目	项目实施地点在王庄村学校房顶，所采用的多晶硅组件，功率为370Wp。光伏组件排布216块，安装容量79.92kWp。选用组串式并网逆变器。		项目实施地点在王庄村学校房顶，采用多晶硅370Wp组件太阳能板272块，100kW光伏逆变器2台以及附属设施建设100.64千瓦光伏发电。
11	山亭区	徐庄镇	2022年徐庄镇现代高效农业种植大棚1号棚（衔接推进区项目1）	建筑面积10592平方米的现代高效农业种植大棚。定位于智慧种植、产品展示、种苗培育、科普研学，打造现代农业综合体。植入智能化系统，补充系统，24小时温控、湿控、水肥一体化、远程操控智能控制系统，项目分为特色种植、种苗培育、产品储存等板块，致力于将传统种植发展为具有规模化种植、科学化管理、规范化加工、品牌化提升的三产融合新格局，并结合研学、体验等功能，实现农旅有效结合，以现代化农业产业带动周围村庄集体经济发展，促进村民增收致富。		建筑面积10592平方米的现代高效农业种植大棚。定位于智慧种植、产品展示、种苗培育、科普研学，打造现代农业综合体。植入智能化系统，补充系统，24小时温控、湿控、水肥一体化、远程操控智能控制系统，项目分为特色种植、种苗培育、产品储存等板块，致力于将传统种植发展为具有规模化种植、科学化管理、规范化加工、品牌化提升的三产融合新格局，并结合研学、体验等功能，实现农旅有效结合，以现代化农业产业带动周围村庄集体经济发展，促进村民增收致富。
12	山亭区	徐庄镇	2022年徐庄镇青年回乡创业项目（衔接推进区项目3）	项目总投资1250万元，其中衔接资金1100万元，协作资金150万元。衔接资金1100万元计划在滕花峪村口位置建设占地1600平方米的青年创业、会客、聚餐、住宿等功能于一体的电商服务中心。收购改造提升滕花峪6处闲置小院，高庄村10处小院，打造甘薯小院、传统油坊小院、核桃小院、山楂小院、电商直播小院等特色乡村小院，小院样式着力突出民俗特色，集创业、线上线下销售、旅游观光示范、网红打卡等功能于一体的产业小院。建设容量100吨的小型冷库600平方米，为滕花峪创业者提供配套服务，完善农业创业发展要素；占地50亩，建设包含连栋大棚、露天农场两部分，大棚面积约3000㎡；协作资金150万元计划在高庄村李响村家下建设抽水站机房，铺设设计为110mm钢管，向三合山顶调水，铺设5000米取水管道，建设200立方米蓄水池。		投资1250万元，其中衔接资金1100万元，协作资金150万元。衔接资金1100万建设青年电商服务中心，中心主体长40.5米、宽16.3米、楼高3层共计2880平方米，定位为青年创业孵化、会客、办公、住宿、直播销售及功能于一体的电商服务中心，在滕花峪村内收购改造提升6处闲置小院，建设容量100吨的小型冷库500立方米，在翼云湖片区建设占地约80亩的青年农场。围绕青年农场配套基础设施，建设长3.5米、高2米的拦河坝3处，建设直径20米、高2米灌溉水池1处，建设高3米，长32米的灌溉水池1处，铺设直径为110毫米的抽水管170米，购买水泵1台，铺设直径为1米的地下排水管道12米，建设绿化带约900平方米附属设施。在高庄村三合山顶自然村，集中收购10处闲置农房并统筹提升，在李响村家下建设抽水站机房1处，向三合山顶自然村提水，投入约28万元在山上架设三相电，铺设规格为110mm输水管道460米，建设约350立方米蓄水池1处、拦水坝1处、机井管理房1处、溢水平台2处，管道沿线留出出水闸门，确保沿途梯田灌溉。
13	山亭区	徐庄镇	2022年徐庄镇徐庄村“百年大集”提升建设项目（衔接推进区项目5）	计划投资衔接资金120万元用于大集基础设施建设，改造3300方给排水管道铺设、强弱电管道铺设、地面硬化、石材铺装、商铺标准摊位修建、钢结构大棚改造等，沿河商铺及公共就餐区域共处，采用碎块砌加轻钢、木头等材料建设		投资衔接资金120万元用于大集基础设施建设特色色窗305.04平方米、建设戏台一座83.08平方米，钢架架403.78平方米、铺设石板地面117.8平方米，防护栏236米、铺设给排水、排水管92米、铺设电线以及配电箱等附属设施，墙面抹灰314.95平方米，卵石石挡土0.6米，36立方米，以及场地平整、夯实、退房开挖回填等。

14	山亭区	徐庄镇	徐庄镇2022年度人居环境提升项目实施方案(衔接推进区项目6)	项目总投资389万元,其中省级衔接资金249万元、农业农村局人居环境整治资金70万元、镇村自筹70万元,计划用省级衔接资金249万元用于:1、改善徐庄镇衔接推进区涉及的12个村的人居环境内“四大堆”清理项目清理堆垛约500堆左右;2、用于建设徐庄镇衔接推进区徐庄村、老君堂村的污水处理设施的建设主要是建设氧化塘一处、处理站一座以及排水管道开挖和回填,以及购买排水管道等附属设施的建设;3、用于衔接推进区12个村的村口、人口密集处、村民丢弃垃圾处建设垃圾分类亭平均每个村约12个垃圾亭,配套垃圾分类垃圾桶共计600个左右,另外增加村内放置垃圾桶约600个,每个村在配备一台小型垃圾清运车计12辆,用于改善村内垃圾乱丢现象培养群众良好的垃圾分类意识,加快美丽乡村建设进度;农业农村人居环境整治资金70万元和镇村自筹资金70万元,用于对衔接推进区村庄进行院坝断壁拆除、衔接推进区涉及12个村打造一村一品示范村,具体为街道的美化、喷绘、街道卫生、杂草清理、花卉苗木种植、路灯的安装,提升农村村民居住环境,加快美丽乡村建设进度。		项目总投资389万元,其中省级衔接资金249万元、农业农村局人居环境整治资金70万元,镇村自筹70万元,购买型号为KDM-800电动翻桶车12辆,购买480*670*670mm的垃圾桶6000个,建设垃圾分类亭144个,清理四大堆4450.67立方米,场地整理平整5868.93平方米,院坝断壁修复5.75立方米,砌垒石挡土墙236.48平方米,工2个门牌58个,铺设混凝土路面3050.29平方米,种植灌木花卉等绿植385株,修建花池56米。
15	山亭区	徐庄镇	2022年米山顶电商研学基地项目	1.建设一处农村平房; 2.利用村集体2处空闲宅基地新建民族特色文化研学基地。		利用村集体2处空闲宅基地新建民族特色文化研学基地、安装金属门窗,室内装修,安装室内产品架,铺设地板砖,土
16	山亭区	水泉镇	2022年大湾村基础设施建设项目	基础设施建设项目:用于村内主干道建设,从山口小庙到倪守启家前长632米,宽5米,约3160平方米。		实际完成用于村内主干道建设,从山口小庙到倪守启家前长632米,宽5米,约3160平方米。实际投资30万元。
17	山亭区	水泉镇	2022年上辛庄村基础设施建设项目	基础设施建设项目:用于村内主干道建设,1、上辛庄东岭村内14段共长1017米,宽3米,高15cm,约3061平方米;2、南泉村内10段共长788米,宽3米,高15cm,约2364平方米;3、沟北村内4段共长413米,宽3米,高15cm,约1239平方米;4、河西村共4段共长519米,宽3米,高15cm,约1557平方米;共合计约8211平方米。		用于村内主干道建设,1、上辛庄东岭村内14段共长1017米,宽3米,高15cm,约3061平方米;2、南泉村内10段共长788米,宽3米,高15cm,约2364平方米;3、沟北村内4段共长413米,宽3米,高15cm,约1239平方米;4、河西村共4段共长519米,宽3米,高15cm,约1557平方米;共合计约8211平方米。实际投资76万元。
18	山亭区	水泉镇	2022年南蒋村基础设施建设项目	基础设施建设项目:用于村内主干道建设,1、界牌村前到村后长658米,宽6米,高15cm,约3948平方米;2、高安桥屋后到三厂山家前长304米,宽4米,高15cm,约816平方米;3、倪印岭到程运富家前长307米,宽2.5米,高15cm,约518平方米;4、南场路口到程运富家前长170米,宽3米,高15cm,约510平方米;合计共约5792平方米。		用于村内主干道建设,1、界牌村前到村后长658米,宽6米,高15cm,约3948平方米;2、高安桥屋后到三厂山家前长304米,宽4米,高15cm,约816平方米;3、倪印岭到程运富家前长307米,宽2.5米,高15cm,约518平方米;4、南场路口到程运富家前长170米,宽3米,高15cm,约510平方米;合计共约5792平方米实际投资55万元。
19	山亭区	水泉镇	2022年朱庄村基础设施建设项目	基础设施建设项目:用于村内主干道建设,长1475米,约3163.2平方米		用于村内主干道建设,长1475米,约3163.2平方米。实际投资30万元。
20	山亭区	水泉镇	2022年李庄村基础设施建设项目	基础设施建设项目:用于村内主干道建设,1、中西路头到闫士明家长769米,宽3米,高15cm,约2307平方米;2、任文贵到任有宏房后长10米,宽2米,高15cm,约20平方米;3、张灯美到颜士强家,长82米,宽2.5米,高15cm,约205平方米;4、村办公室门口到任文贵家,长31米,宽1米,高15cm,约34平方米;5、颜成才到颜长国,长47米,宽3.5米,高15cm,约164.5平方米;6、颜伟到颜士付,长46米,宽3米,高15cm,约138平方米;共合计约3175.5平方米。		用于村内主干道建设,1、中西路头到闫士明家长769米,宽3米,高15cm,约2307平方米;2、任文贵到任有宏房后长10米,宽2米,高15cm,约20平方米;3、张灯美到颜士强家,长82米,宽2.5米,高15cm,约205平方米;4、村办公室门口到任文贵家,长31米,宽1米,高15cm,约34平方米;5、颜成才到颜长国,长47米,宽3.5米,高15cm,约164.5平方米;6、颜伟到颜士付,长46米,宽3米,高15cm,约138平方米;共合计约3175.5平方米。实际投资30万元。
21	山亭区	水泉镇	2022年魏沟村基础设施建设项目	基础设施建设项目:用于村内主干道建设,1、魏沟村水池到西山路长200米,宽3米,高15cm,约600平方米;2、下魏沟村前到大口井长200米,宽3米,高15cm,约600平方米;3、粮卷小水池到老村长200米,宽3米,高15cm,约600平方米;4、于泥汪泉水池到老村长300米,宽3米,高15cm,约900平方米;5、王庄学校西到欢山岭长200米,宽2米,高15cm,约400平方米;共合计约3200平方米。		用于村内主干道建设,1、魏沟村水池到西山路长200米,宽3米,高15cm,约600平方米;2、下魏沟村前到大口井长200米,宽3米,高15cm,约600平方米;3、粮卷小水池到老村长200米,宽3米,高15cm,约600平方米;4、于泥汪泉水池到老村长300米,宽3米,高15cm,约900平方米;5、王庄学校西到欢山岭长200米,宽2米,高15cm,约400平方米;共合计约3200平方米。实际投资30万元。
22	山亭区	水泉镇	2022年板上村基础设施建设项目	基础设施建设项目:用于村内主干道建设,1、张传海家到高鹏家门长305米,宽3米,高15cm,约915平方米;2、李兴花家到潘纪成家北,长210米,宽3米,高15cm,约630平方米;3、杨加生家至韩发根家150米,宽3米,高15cm,约450平方米;4、杨领家到潘文家71米,宽3米,高15cm,约213平方米;5、韩文彬家到张传生家70米,宽3米,高15cm,约210平方米;6、张传友门口至潘文家34米,宽3米,高15cm,约102平方米;7、韩顺虎家到潘纪成家50米,宽3米,高15cm,约150平方米;共合计约2670平方米。		用于村内主干道建设,1、张传海家到高鹏家门长305米,宽3米,高15cm,约915平方米;2、李兴花家到潘纪成家北,长210米,宽3米,高15cm,约630平方米;3、杨加生家至韩发根家150米,宽3米,高15cm,约450平方米;4、杨领家到潘文家71米,宽3米,高15cm,约213平方米;5、韩文彬家到张传生家70米,宽3米,高15cm,约210平方米;6、张传友门口至潘文家34米,宽3米,高15cm,约102平方米;7、韩顺虎家到潘纪成家50米,宽3米,高15cm,约150平方米;共合计约2670平方米。实际投资25万元。
23	山亭区	水泉镇	2022年东堰村基础设施建设项目	基础设施建设项目:用于村内主干道建设,长2405.5米,高15cm,合计约7134.25平方米		用于村内主干道建设,长2405.5米,高15cm,合计约7134.25平方米。实际投资67万元。
24	山亭区	水泉镇	2022年下湾村基础设施建设项目	基础设施建设项目:用于村内主干道建设,长1512米,高15cm,合计约4280.3平方米		用于村内主干道建设,长1512米,高15cm,合计约4280.3平方米。实际投资40万元。
25	山亭区	水泉镇	2022年柴胡村基础设施建设项目	基础设施建设项目:用于村内主干道建设,1、柴胡村小广场到许文章家200米,宽3.5米,高15cm,约700平方米;2、西柴胡村堤头到侯才厚后长695米,宽3.5米,约2430平方米;3、侯磊家到侯爱喜地长94米,宽3米,高15cm,约282平方米;4、砖厂旧宿舍到旧变压器房长110米,宽3米,高15cm,约330平方米。硬化生产路:1、许文义地到白太太地长230米,宽2米,高15cm,约460平方米;2、侯爱喜地到小泉水池长180米,宽2米,约360平方米;共合计约4562平方米		用于村内主干道建设,1、柴胡村小广场到许文章家200米,宽3.5米,高15cm,约700平方米;2、西柴胡村堤头到侯才厚后长695米,宽3.5米,约2430平方米;3、侯磊家到侯爱喜地长94米,宽3米,高15cm,约282平方米;4、砖厂旧宿舍到旧变压器房长110米,宽3米,高15cm,约330平方米。硬化生产路:1、许文义地到白太太地长230米,宽2米,高15cm,约460平方米;2、侯爱喜地到小泉水池长180米,宽2米,约360平方米;共合计约4562平方米。实际投资40万元。
26	山亭区	山城街道	2022年度棋岭堆村基础设施建设项目	基础设施项目:计划利用混凝土硬化路面一是村东至山西生产路,长1000米、宽2.5米、厚度0.15米,计2500平方米;二是团洼至棋山前生产路,长264.8米、宽2.5米、厚度0.15米,计662平方米;三是办公室南路,长45米、宽10米、厚度0.15米,计675平方米;四是村南路长148米、宽6米,厚度0.15米,计888平方米。共计硬化生产路4500平方米。计划投资42.4651746万元。		基础设施建设项目:实际利用混凝土硬化路面一是村东至山西生产路,长1020米、宽2.5米、厚度0.15米,计2550平方米;二是团洼至棋山前生产路,长264.8米、宽2.5米、厚度0.15米,计662平方米;三是办公室南路,长45米、宽10米、厚度0.15米,计675平方米;四是村南路长359.2米、宽2.5米、厚度0.15米,计898平方米。共计硬化生产路4500平方米。实际投资40万元。
27	山亭区	山城街道	2022年度桂子山村基础设施建设项目	基础设施项目:计划一是利用混凝土硬化大宽村三条生产路,长680米、宽2米、厚度0.15米,合计1360平方米;二是孙沃自然村两条生产路,孙沃村南至山口长150米,宽3米,山口地至狗泉地长420米,宽2.5米,合计1500平方米,厚度0.15米;三是桂子山自然村四条生产路,洼子地至南山长150米,宽3米,老林场至山头长240米、宽1.5米,袁景李家至大山顶长320米、宽1.5米,二坝头至小白峪长240米、宽1.5米,合计1520平方米,厚度0.15米。共计硬化桂子山村生产路4380平方米。计划投资41.514363万元。		基础设施建设项目:实际一是利用混凝土硬化大宽村三条生产路,长730米、宽2米、厚度0.15米,合计1460平方米;二是孙沃自然村两条生产路,孙沃村南至山口长150米,宽3米,山口地至狗泉地长400米、宽2.5米,合计1400平方米,厚度0.15米;三是桂子山自然村四条生产路,洼子地至南山长150米、宽2米,老林场至山头长240米、宽1.5米,袁景李家至大山顶长240米、宽2米,二坝头至小白峪长144米、宽2.5米,合计1820平方米,厚度0.15米。共计硬化桂子山村生产路4880平方米。实际投资40万元。
28	山亭区	北庄镇	2022年北庄镇高质高效杂粮基地、引种改良葡萄品种项目(北庄镇衔接推进区项目1)	(1)计划实施田地土壤改良及覆土增厚工程、新建提水泵1处、蓄水池除漏3处、节水灌溉水利设施配套管网4000米。 (2)计划引进优质葡萄品种阳光玫瑰1000余株、郑艳无核300余株、红艳无核700余株。		(1)实际实施田地土壤改良及覆土增厚工程、新建提水泵1处、蓄水池除漏3处,节水灌溉水利设施配套管网4000米。 (2)实际引进优质葡萄品种阳光玫瑰1000余株、郑艳无核300余株、红艳无核700余株。
29	山亭区	北庄镇	2022年北庄镇农产品电子商务服务中心项目(北庄镇衔接推进区项目2)	计划建设农产品电子商务服务中心一座,长80.26米,宽15.96米,高3层,总面积达2962.06平方米(每层955.43平方米、设备间95.76平方米)		实际建设农产品电子商务服务中心一座,长80.26米,宽15.96米,高3层,总面积达2962.06平方米(每层955.43平方米、设备间95.76平方米)

30	山亭区	西集镇	西集镇刘庄村基础设施建设项目	刘庄村村内道路硬化工程，具体位置为杨架新屋后至张同菊门口，长度220米，宽度3米；杨兵建门口至裴中门口，长度120米，宽度3米；陈生门口至朱士文门口，长度85米，宽度3米；沿河路至韩建海、姜兴军、刘士通门口三条路，长度140米，宽度3米；刘宗杰屋后至刘龙吉、姜兴伦门口，长度200米，宽度3米；刘宗光门口至顾德坤门口，长度133米，宽度3米；刘聚吉门口至刘狄吉、刘水吉门口，长度120米，宽度3米；刘军吉墙角至顾德元墙角，长度188米，宽度3米；刘宗保门口至水厂西北墙角，长度100米，宽度3米；王训学屋后至河坝南，长度120米，宽度5米。以上道路厚度均为0.14米，共计4460平方米，硬化方式为水泥混凝土。	刘庄村村内道路硬化工程，杨架新屋后至张同菊门口；杨兵建门口至裴中门口；陈生门口至朱士文门口；沿河路至韩建海、姜兴军、刘士通门口三条路；刘宗杰屋后至刘龙吉、姜兴伦门口；刘宗光门口至顾德坤门口；刘聚吉门口至刘狄吉、刘水吉门口；刘军吉墙角至顾德元墙角；刘宗保门口至水厂西北墙角；王训学屋后至河坝南。以上道路厚度均为0.14米，共计4460.1平方米，硬化方式为水泥混凝土。
31	山亭区	西集镇	西集镇冯庄村基础设施建设项目	硬化冯庄村村内道路，具体位置为冯庄村自然村韩大军门口至杨尚乾门口，长度365米，宽度4米，厚度0.15米，路两侧安装排水管道；朱屯自然村褚衍义家东至褚夫举家西，长度327米，宽度3.5米，厚度0.15米。庄新庄自然村庄夫乐房子东至庄洋洋房子西，长度330米，宽度4米，厚度0.15米；总长度1022米，共计352.4平方米。	冯庄村自然村韩大军门口至杨尚乾门口，长度365米，宽度4米，厚度0.15米；朱屯自然村褚衍义家东至褚夫举家西，长度327米，宽度3.5米，厚度0.15米；庄新庄自然村庄夫乐房子东至庄洋洋房子西，长度330米，宽度4米，厚度0.15米；实际硬化面积4325.99平方米。原设计排水管道工程施工条件不允许未进行施工。
32	山亭区	西集镇	西集镇马庄村基础设施建设项目	硬化马庄村村内道路，姜加营家至家属院，长度38米，宽度3.5米，周升革家至褚保柱家，长度63米，宽度3.2米；张宗云家至王夫举家，长度183米，宽度6米；张峰家至褚庆华家，长度32米，宽度6.4米；李玉水至孙茂珠家，长度23米，宽度3.2米；孟庆海家门口长度16米，宽度3米；朱庄西一马西新家，长度6米，宽度3米；任士长家一新源路，长度300米，宽度3米；马庄新村东至庄村，长度300米，宽度3.5米；褚衍烈门口长度41米，宽度3米。以上道路厚度均为0.13米，合计4779平方米。	姜加营家至家属院，长度38米，宽度4米；周升革家至褚保柱家，长度72米，宽度3.55米；张宗云家至王夫举家，长度125米，宽度7米；张峰家至褚庆华家，长度32米，宽度6.4米；李玉水至孙茂珠家，长度23米，宽度3.2米；孟庆海家门口长度16米，宽度3米；朱庄西一马西新家，长度6米，宽度3.3米；任士长家一新源路，长度473米，宽度3米；褚衍烈门口长度41米，宽度3米。以上道路厚度均为0.13米，实际完成3553.76平方米道路硬化，硬化方式为水泥混凝土。新建排水沟160米，宽度1米，安装铸铁井盖19个。
33	山亭区	西集镇	西集镇河南村基础设施建设项目	河南村自然村村内道路铺设柏油路面，王孝友门口至孙晋芳门口，长度400米，宽度4米；张元友门口至蒋成启门口，长度400米，宽度4.35米；田家芳门口至蒋成肇门口，长度500米，宽度4.5米；范虎门口至周鑫门口，长度400米，宽度4.2米，以上道路厚度均为0.04米，面积7270平方米。河南小学后墙长度70米，宽度4.5米，马丙举家门口，长度50米，宽度2米，马丙峰门口，长度200米，宽度4米，以上道路厚度0.15米，面积1216平方米。	河南村自然村村内道路铺设柏油路面，王孝友门口至孙晋芳门口；张元友门口至蒋成启门口；田家芳门口至蒋成肇门口；范虎门口至周鑫门口；河南小学后墙；马丙举家门口；马丙峰门口，实际完成道路硬化面积8458.05平方米。
34	山亭区	西集镇	西集镇南河岔村基础设施建设项目	硬化村内道路，柏孝龄门口至柏孝兴门口，长度450米，宽度6米，厚度0.16米，柏孝义屋后至张夫启门口，长度100米，宽度3.5米，厚度0.16米，共计3050平方米道路硬化。	南河岔村柏孝龄门口至柏孝兴门口，长度430米，宽度6米，厚度0.16米；柏孝义屋后至张夫启门口，长170米，宽度3.5米，厚度0.15米，实际完成3115平方米道路硬化，硬化方式为水泥混凝土。
35	山亭区	冯卯镇	2022年冯卯镇西岩下田园村居项目	该项目主要包括三方面建设内容： 第一、统一规划，修缮老屋，新建院墙，翻耕土地，不搞大拆大建，保留每位宅基地痕迹。针对质量良好老屋，改建书屋、公厕等公益性建筑；针对有使用价值的老屋，进行修缮，改建成温室，养殖菌菇等经济作物；针对破损严重房屋，进行必要拆除、保证安全。院墙或建、或拆，就地取材，统一高度。院内土地、空闲地整理翻耕，建成良田。鱼塘整修。 第二、项目区建设生产路、灌溉系统等配套基础设施，购买农机具。 第三、屋内、院内统一规划种植西红柿、蘑菇、向日葵等经济作物。	第一、实际完成屋顶拆除2237.96㎡，拆除墙体5363.48㎡，清除地面8415.4㎡，种植土回填7524.96㎡，照明接电3户，配电箱3台，硬化道路2218.4㎡，挖鱼塘3960立方米，排水管40米，房屋修缮3座，沿河路围墙230米，钢丝绳529米，沿河路围墙47.5立方米，石围堰259.26立方米，石梁架3套，休息亭402.32平方米等，实际投资110.038955万元。 第二、实际完成道路硬化2218.4平方米，建设采光大棚4745.62㎡，灌溉系统一套，仓库1座，购置微耕机等农用机械1台套，实际投资67.71298万元。
36	山亭区	冯卯镇	2022年冯卯镇第一书记包村道路硬化项目	基础设施建设项目。计划在北赵庄村及自然村姚沃村实施新建道路硬化7条，其中修复改建位于北赵庄村内的5条小巷，修复总长度约1167米、宽度约3米，约3500平方米；新建硬化2条道路，一条位于姚沃村邢开晋户在北至邢开金户路段，硬化长度约300米、宽度约3米，约900平方米。另一条位于姚沃村东生产路，长度约914米、宽度约3米，约2740平方米，该生产路包括路缘整理，共计约7140平方米。	因本地无法达到修复路面的技术，所以进行了新建道路数量的变化。
37	山亭区	冯卯镇	2022年冯卯镇别庄村道路硬化项目	基础设施建设项目。计划对别庄村内蒋继光屋后东西街、张长围门前东西街、吴春林屋南南北街等多条道路实施路面硬化工程，总长度约1916米，宽度约3米，厚度14cm，约5750平方米。	基础设施建设项目。实际完成硬化别庄村内道路C25混凝土厚度14cm共5450平方米，实际投资48.604939万元。
38	山亭区	冯卯镇	2022年冯卯镇西岩下村道路硬化项目	基础设施建设项目。计划对西岩下村南生产路实施路面硬化工程，其中3米宽路段长度约1277米，4米宽路段长度约451米，厚度18cm，总面积约5535平方米。	基础设施建设项目。实际完成硬化西岩下村南山生产路C25混凝土厚度18cm共5632.8平方米，实际投资50万元。
39	山亭区	冯卯镇	2022年冯卯镇温庄村道路硬化项目	基础设施建设项目。计划对温庄村北山生产路实施道路硬化工程，长度约770米，宽度3米，厚度12cm，约2310平方米。	基础设施建设项目。实际完成硬化温庄村北山生产路C25混凝土厚度12cm共2103平方米，实际投资20.978888万元。
40	市中区	齐村镇	齐村镇韩庄村羊粪子泉生态农业专业合作社蔬菜大棚建设项目	项目共建设四个大棚，计划占地 22.6 亩，灌溉用机井 1 口等	冬暖温室两座（80m*14m 和 32m*20m）与新型全钢架拱形大棚两座（28m*8m 和 31m*8m）、配套设施新打机井一处、潜水泵购置安装离心式深水泵一套（含泵管、电缆等配件），实际投资407431.84 元。
41	市中区	齐村镇	齐村镇柏山村鑫源农机服务农民专业合作社蔬菜大棚建设项目	项目计划占地 25 亩，共建设 3 个暖棚，暂定数据 2.5亩每个棚（长 120m*14m），修建大棚生产路 220米，灌溉用机井 2口和自动滴灌设施若干等。	冬暖日光温室、水灌溉系统、棚外管网部分、棚内滴管系统、生产路、清单外工程量、土地整治平整、棚前挖水沟等，实际投资800816元
42	市中区	齐村镇	2022年齐村镇刘庄村养殖产业合作社建设项目	55M*10M*4M，饲料间、蛋库、自动化养鸡设备、备用发电机等若干配套设施。	一、鸡舍厂房（独立基础部分 1.2m*1.21m钢结构部分 H350 钢柱结构；墙体 350*190*190 砌块到顶；室内地面 100mm 厚 C30 依一地面）二鸡舍养鸡设备（80C 玻璃钢塔筒玻璃钢材料；料槽厚度 1.0mm；）三、饮水系统（水线将塔筒水组件、管材料厚度、后墙排水）四、客户各造粪具系统（16 长，1.9 米过道兼沟口户罩板；声光报警系统；三层合金观察车），实际投资1380117.77 元。
43	市中区	孟庄镇	2022年孟庄镇峨山村乡村振兴第一书记惠民路	计划建设完成峨山村1、北庄道路硬化约2100平方（700*3）；2、峨山村老庄道路硬化2000平方（670*3），厚0.16cm,C30标准道路新共4100平方，投资43.5万元	实际建设完成峨山村1、北庄道路硬化约2100平方（700*3）；2、峨山村老庄道路硬化2000平方（670*3），厚0.16cm,C30标准道路新共4100平方，投资40万元。
44	市中区	孟庄镇	市中区现代农业融合发展集中推进区一鲜农现代农旅融合产业园	计划建设完成侯庄村口于汪河东南，建设农旅融合产业园温室大棚，面积7200平方米及配套设施。投资328.822917万元，	建设农旅融合产业园温室大棚，面积7200平方米及配套设施。投资300.580929万元
45	市中区	孟庄镇	市中区现代农业融合发展集中推进区一高效现代农业孵化中心观光温室大棚	计划建设完成高效现代农业孵化中心观光温室大棚约4500平方。投资约157.010059万元	实际建设内容为高效现代农业孵化中心观光温室大棚4416平方，投资150.671949
46	市中区	孟庄镇	市中区现代农业融合发展集中推进区一顺成名优中药材百草园药材初加工车间	新建中药材初加工车间一处，约810平方米（长约54米*宽约15米高约6米）。投资51.75	新建中药材初加工车间一处，约810平方米（长约54米*宽约15米高约6米）。投资50
47	市中区	税郭镇	2022年南安城村屋顶光伏发电项目	计划利用村内闲置屋顶，建设约120千瓦屋顶光伏发电站。	在税郭镇南安城村村委会房顶和红白会大棚顶建设120kw分布式光伏项目，其中税郭镇南安城村村委会房顶所安装电站为51.23kw，红白会大棚顶所安装电站为68.77kw，投资40万元
48	市中区	税郭镇	2022年汪庄村屋顶光伏发电项目	计划利用村内闲置屋顶，建设约120千瓦屋顶光伏发电站。	在税郭镇汪庄村屠宰场屋顶建设108kw分布式光伏项目，
49	市中区	西王庄镇	2022年枣庄市西王庄镇西街村105千瓦光伏发电项目	计划建设105千瓦分布式光伏发电项目，铺设面积520平方米，光伏组件，460瓦单晶硅组件225块。	完成建设105千瓦分布式光伏发电项目，铺设面积520平方米，光伏组件，460瓦单晶硅组件225块。

50	市中区	光明路街道	2022年度市中区-光明路-雷村(王庄)村委会大院改建仓储项目	计划在光明路雷村(王庄)原村委会大院,占地面积约1800平方米,主体结构框架,柱子与天梁采用型钢槽钢+型钢槽钢,每3米开间,檐高3米,横跨19+18米,厂房南北46米,东西32米,柱坑独立共36个,其余配套水电、门窗、照明等。		经项目验收合格后,项目实际建设仓储48.5长*32.7宽,约1585.96平方米,项目工程总投资约98.963619万元,该项目最终结算价款为98.963619万元。
51	市中区	光明路街道	2022年度市中区-光明路-官地村党支部合作社花卉采摘综合体建设项目	该项目计划在光明大道与东外环交叉口东北角,原废弃荒地,占地面积约20亩。主体结构框架大棚共6个,总建筑面积约2400平方米,其余配套水电、门窗、照明等。项目计划总投资45万元,其中:市财政(第一书记)衔接资金40万元,村自筹5万元。		经项目验收测量后,实际建设建设5座钢结构温室大棚,分别是:480平方米*3个、450平方米*1个、432平方米*1个,项目工程总投资40.8672万元,该项目最终结算价款为40.8672万元。
52	市中区	永安镇	遗寨村第一书记创办农业示范园项目	第一书记40万资金主要用于前期土地灌溉、排水沟、生产路等基础设施建设,后期与药厂企业签订合同,大面积种植中药材,有效增加村集体稳定收入,巩固脱贫攻坚成效,助力乡村振兴。		建成钢网围墙730米,水泥地面435.32平方米,生产用排水沟464.7米,深水井配置1套,监控配置1套及三相电安装等
53	市中区	永安镇	永安镇西山阴村合作社种植建设项目	该项目主要建设内容分为南棚和北棚,其中:南棚建造宽13米,长度58米温室大棚一座,约754平方;北棚建造宽13米,长123米温室大棚一座,约1599平方;铺设排水管道3条259.5米,硬化路面217.2平方米,大棚配套灌溉面积2353平方米,深井2眼及配套,安装监控摄像头6个,路灯3个,建设大棚侧面管理房2处及温室大棚保温棉被(配自动卷机),遮阳网。项目投资预算42.3760万元。		南棚建造宽13米,长度58米温室大棚一座,约754平方;北棚建造宽13米,长123米温室大棚一座,约1599平方;铺设排水管道3条259.5米,硬化路面217.2平方米,大棚配套灌溉面积2353平方米,深井2眼及配套,安装监控摄像头6个,路灯3个,建设大棚侧面管理房2处及温室大棚保温棉被(配自动卷机),遮阳网。
54	滕州市	鲍沟镇	滕州市-鲍沟镇_产业项目_2022年度滕州市鲍沟镇高村中村党支部第一书记合作共建冷库项目(一批)	与滕州市鑫剑农机服务专业合作社合作共建冷库加工项目,建设地点位于鲍沟镇三村,资金主要用于合作共建冷库1座,规划面积2500平方米,可存储面筋4500吨。	滕州市鑫剑农机服务专业合作社购买架900个	购买架900个,单价445元,实际投资400500元
55	滕州市	鲍沟镇	滕州市-鲍沟镇_村基础设施_2022年度滕州市鲍沟镇_道路硬化、排水设施、路灯安装建设项目(二批)	1、道路硬化。闫庄村,硬化厚度15厘米,硬化路总长度240米、路宽4米,硬化面积9060平方米,计划投资137万元。 2、排水沟工程。鲍沟二村,新建排水沟,预计投资47万元。 3、路灯安装工程。在干岔村安装太阳能路灯25盏,计划投资5万元;邢寨村安装太阳能路灯32盏,计划投资6万元;议官村安装太阳能路灯32盏,计划投资5万元。以上工程通过集中公开招标选择施工队伍,同步施工。		1、道路硬化。闫庄村,硬化厚度15厘米,硬化路总长度240米、路宽4米,硬化面积9060平方米,计划投资137万元。 2、排水沟工程。鲍沟二村,新建排水沟,预计投资47万元。 3、路灯安装工程。在干岔村安装太阳能路灯25盏,投资4.625万元;邢寨村安装太阳能路灯32盏,投资5.92万元;议官村安装太阳能路灯32盏,投资5.105万元。
56	滕州市	滨湖镇	滕州市-滨湖镇_村基础设施_2022年度滨湖镇前都郎村第一书记基础设施建设项目(一批)	(1)硬化道路:长约800米(包含下水道铺设后硬化),宽4米,厚15cm,共计8300平方米,约936万元。 (2)下水道建设:村南北路(小学西)下水道,长约200米,宽4米,涵洞侧加水泥管,设5座观察井,预算价14万元。 设计工程造价为512万元。		(1)硬化道路:(包含下水道铺设后硬化),宽3-4米,厚15cm,共计3447.39平方米。 (2)下水道建设:村南北路(小学西)下水道,长约200米,宽4米,涵洞侧加水泥管,设5座观察井。
57	滕州市	滨湖镇	滕州市-滨湖镇_村基础设施_2022年度滕州市滨湖镇_道路硬化、排水设施、路灯安装建设项目(二批)	项目实施地点位于滨湖镇邵村,具体情况如下: 道路硬化450米,3米-5米宽不等,厚18cm,面积约1400平方米;下水道红砖筑墙埋明沟,沟底垫层,沟深50cm,沟宽30cm,共1100米;工程总费用41166.78元。		道路硬化厚18cm,面积约1133.58平方米;下水道红砖筑墙埋明沟,沟底垫层,沟深50cm,沟宽30cm,共1152.4米;
58	滕州市	柴胡店镇	滕州市-柴胡店镇_产业发展_2022年度滕州市柴胡店镇保鲜冷库建设项目(衔接乡村振兴集中推进区产业项目1)枣庄一业	柴胡店镇衔接资金300万元与山东沐林生态农业科技有限公司(滕州欣源种植农场)签订经营和管理协议,合作共建3000吨保鲜冷库一座,建设分栋车间2处、约2000平方米,项目建成后延长果品上市时间,增加果品附加值。		合作共建3000吨保鲜冷库一座。
59	滕州市	柴胡店镇	滕州市-柴胡店镇_乡村建设行动_农村基础设施(含产业配套设施)2022年度滕州市柴胡店镇衔接乡村振兴集中推进区人居环境整治及基础设施建设项目(枣庄200米级300)	1、道路硬化工程:新建园区内道路长2100米、8500平方米、18cm厚C25混凝土路面和高效农业园内长450米、1350平方米、18cm厚C25混凝土路面,约130万元,利用枣庄市衔接资金。 2、村内排水工程:新修沙庄村、南胡楼村、戴箕掌村下水道2739.4米。分别为:沙庄村砖砌盖板排水沟300*300、802米,砖砌盖板排水沟300*400、104米;南胡楼村砖砌盖板排水沟300*400、67米,砖砌无盖板排水沟400*400、223米,DN200波纹管排水管(C25砼包封)223米;戴箕掌村砖砌盖板排水沟300*400、83.4米,原有300*400砖砌排水沟清淤并新增盖板284米,DN300波纹管排水管(C25砼包封)600米,砖砌盖板排水沟400*400、276米,砖砌排水沟400*400(安装篦子)41米,约70万元,利用枣庄市衔接资金。 3、实施人居环境整治工程:实施沙庄村、何庄村、戴箕掌村、小石楼村人居环境整治。分别为:沙庄村宅基地拆除清理及回填126.35平方米,场地平整及外运挖30覆土50、20208平方米,场地平整及外运挖30覆土50、8948平方米,戴箕掌村宅基地平整及外运挖30覆土50、22688平方米,小石楼村场地平整及外运挖30覆土50、8036平方米,清淤30cm及外运5450平方米。约210万元,利用滕州市衔接资金。 4、杨桥村(小王楼)道路硬化工程:新建杨桥村420米,约1700平方米、15cm厚C25混凝土路面,约20万元,利用滕州市衔接资金。		道路硬化12090.88平方米,对5个村人居环境集中整治,推进区内下水道建设2477.71m
60	滕州市	柴胡店镇	滕州市-柴胡店镇_乡村建设行动_农村基础设施(含产业配套设施)2022年度滕州市柴胡店镇高桥村第一书记基础设施建设项目(一批)	项目实施地点位于柴胡店镇高桥村,主要为开挖下水管道约105米,硬化道路约230米,安装太阳能路灯50盏,布设排水管道80米。		开挖下水管道约1594.1米,硬化道路约1530米,安装太阳能路灯90盏。
61	滕州市	柴胡店镇	滕州市-柴胡店镇_乡村建设行动_农村基础设施(含产业配套设施)2022年度滕州市南胡楼村第一书记基础设施建设项目(一批)	项目实施地点位于柴胡店镇南胡楼村,主要为村南长650米(东部约300米、西部约350米)的排洪设施进行整修建设及村农田水利设施建设。		对村南长1081.8米的排洪设施进行整修建设及村农田水利设施建设。
62	滕州市	柴胡店镇	滕州市-柴胡店镇_乡村建设行动_农村基础设施(含产业配套设施)2022年度滕州市柴胡店镇道路硬化建设项目(二批)	柴胡店村硬化厚度15厘米,硬化路总长350米、宽4米,硬化面积1440平方米。郝庄村硬化厚度15厘米,硬化路总长235米、宽3米,硬化面积765平方米,硬化厚度15厘米,硬化路总长176米、宽4米,硬化面积704平方米,共计:1469平方米。		道路硬化3046.7486平方米
63	滕州市	大坞镇	滕州市-大坞镇_产业项目_2022年度滕州市大坞镇农产品深加工合作共建项目(一批)	计划建设钢结构厂房3500平方米,具体建设规模,以实际设计建设标准为准。厂房建成后,租赁给山东海通农业科技有限公司使用,带动本村及周边村劳动就业,增加村集体收入,促进产业发展,助推乡村振兴。		项目建设钢结构厂房面积3032.23平方
64	滕州市	大坞镇	滕州市-大坞镇_村基础设施_2022年度滕州市大坞镇池头西村第一书记道路硬化安装路灯开挖排水沟设施建设项目(一批)	1、硬化村内道路:村内部分道路未硬化,村民出行困难,严重影响村民的生产、生活,现村民强烈要求硬化,需要硬化道路约210米长,4米宽。路基运土回填整平压实,硬化厚度不少于18cm,水泥石粉不低于C25,路面表层收光,切割防撞,预计费用约10.08万元。 2、排水设施:鉴于村内老排水沟被填平,每年雨季积水排不出去,造成内涝,需砌筑加盖板,建设长度1000米,预算价22.8万元。涵洞侧加高压水泥管60米,预算价4.7万元。两条下水道建设预计工程造价27.5万元 3、安装太阳能路灯:村主干道及高架桥下约55余盏,约2.92万元。		大坞镇池头西村使用2022年度乡村振兴衔接资金40万元(枣庄市派第一书记帮扶资金),实施了第一书记基础设施建设项目,新建水泥道路硬化面积509.63平方米,铺设管道1015.5米,新建水侧管(内径φ100mm)135.6米,安装太阳能路灯75盏
65	滕州市	大坞镇	滕州市-大坞镇_村基础设施_2022年度滕州市大坞镇东立里村第一书记道路硬化安装路灯开挖排水沟设施建设项目(一批)	1、鉴于村内无排水管网基础设施,每年雨季积水排不出去,造成内涝,影响生产、生活安全情况,需开挖、铺设排水管网1100米,在合适间隔加设沉淀池共32个,连通排放,彻底解决村民生活排水及汛期排水问题。排水管网开挖、铺设完毕,共需整理、硬化地面360㎡,同时在排水管网上回填、硬化地面,改善村庄生活环境。 2、设立路灯70个,方便村民生产、生活。		大坞镇东立里村使用2022年度乡村振兴衔接资金40万元(枣庄市派第一书记帮扶资金),实施了第一书记基础设施建设项目,新建水泥道路硬化面积1402.5平方米,铺设排水管道1732.3米,安装水侧管42套、安装高标准太阳能路灯72盏
66	滕州市	大坞镇	滕州市-大坞镇_村基础设施_2022年度滕州市大坞镇东立里村第一书记道路硬化安装路灯开挖排水沟设施建设项目(二批)	(一)建设内容 1、洪山口村:在村东新建生活污水管网630米;安装带杆太阳能路灯20盏;预算预计10万元。 2、姜庄村:在村内道路硬化385米,宽度3米,面积1155平方米;预算12.8万元; 3、马楼村:新安装太阳能路灯30盏;预算1.2万元; 4、秋庄村:村南道路硬化长度330米,宽度4米,硬化面积1320平方米,预算14万元; 5、小坞村:在村内新建水泥道路硬化,预算12万元; 以上各阶段具体施工内容可能会根据实际情况需要进行适当调整,最终以实际发生工程内容及工程量为准。		大坞镇东立里村使用2022年度乡村振兴衔接资金40万元(枣庄市派第一书记帮扶资金),实施了第一书记基础设施建设项目,新建水泥道路硬化长度975米,面积3158.97平方,新建污水管网长度560米

67	滕州市	东郭镇	滕州市 村基础设施 滕州市 东郭镇 村基础设施 2022年度滕州市东郭镇村基础设施建设项目(第一批)	项目实施地点位于东郭镇温庄村,计划硬化道路约3340平方米,采用C25水泥混凝土面层,厚度15厘米。	水泥硬化道路厚度15cm的C25, 3340.12平方米。
68	滕州市	东郭镇	滕州市 东郭镇 乡村建设行动 农村基础设施(含产业配套基础设施) 2022年度基础设施建设项目(第二批)	1.李王庄村道路硬化,硬化厚度15厘米,硬化面积约2500余平方米。 2.中明村道路硬化,硬化厚度15厘米,硬化面积约1360余平方米。 3.黄园村排水沟工程,对村中街路北两侧沟宽30厘米、高50厘米排水渠,使用加筋盖板规格为长50厘米、宽50厘米,总长度约570米。	1.李王庄村水泥硬化道路2厚度15cm的C25, 506.67平方米; 2.中明村水泥硬化道路厚度15cm的C25, 1368.9平方米; 3.黄园村修建排水沟570.7米。
69	滕州市	东沙河	滕州市 东沙河镇 村基础设施 2022年度滕州市东沙河镇村基础设施建设项目(第二批)枣庄(42.56,省6.25)	1、前梁村排水设施工程。对村东西中心街路两侧挖排水沟1300米,其中DN500高压排水管安装铺设104米;砌筑排水沟宽0.9米*0.7米*1000米铺,10厘米垫层,加浆(1.2米*0.5米*0.12米)砼盖板,及混凝土路面切割、破除、外运、恢复等附属工程。 2、姜桥村排水设施工程。对村两条中心街路挖排水沟450米,加盖(1米*0.5米*0.12米)砼盖板,下水沟内径宽0.6米,高0.6米,下铺10厘米垫层;加砼盖板450米。 3、对村两条南北大街建设开挖恢复管道、铺设自来水管1500米,御泉集中供水点、安装水表12个,安装潜水泵1台。具体工程量,以实际设计建设内容为准。	前梁村-1、铺设DN500高压混凝土过路埋地排水管道50米; 2、混凝土砌块水泥砂浆砌筑排水沟887米,管内内径:800mm、600mm,500mm*100mm钢筋水泥盖板,100mm混凝土垫层,墙面抹灰;3、混凝土路面切割:130.5米;4、混凝土路面破除及外运(厚度18cm):257.44平方米;5、C25混凝土路面恢复257.44平方米;6、C25混凝土路面(厚度:8cm)1413.72平方米;姜桥村-1、铺设DN500高压混凝土过路埋地排水管道58米;2、混凝土砌块水泥砂浆砌筑排水沟223.5米;管内内径:600mm、500mm,500mm*900mm钢筋水泥盖板,100mm混凝土垫层,墙面抹灰;3、混凝土路面切割:200.74平方米;4、混凝土路面破除及外运(厚度18cm):100.37平方米;5、C25混凝土路面恢复100.37平方米;6、DN300埋地排水管89.7米;大弄德村:1、管沟开挖恢复、切割砼地面,破除砼地面,开挖管沟土方,安装管道后,回填管沟土方,恢复砼路面1448.4米;2、塑料管安装、热熔连接:DN85PE管1448.4米, DN25PE管18米;3、DN65阀门4个;4、砌体出水口(多孔砖240*115*90、砌筑、勾缝、外侧面水泥砂浆)12座;5、DN25水表及安装12个;6、200QJ40-78-15KW潜水泵及安装1台。
70	滕州市	东沙河	滕州市 东沙河镇 村基础设施 张街村枣庄市派第一书记基础设施建设项目(第一批)枣庄	自来水管设施建设工程 为张街村2条主街、21条副街修建自来水管,用于开挖管沟并铺设耐压波纹管,2条主街长1400m,21条副街长1900m,配备入户水表池、水表等 道路排水设施建设工程 对村内开挖管沟并建设下水道,开挖管沟并铺设耐压波纹管(规格Φ30cm)1300m。 道路硬化修复工程 对村内生活道路两条硬化翻新,对原坝路路面进行开挖整平,复铺水泥硬化路面约230m,其中110m*4m一条,120m*3m一条,厚度15cm,合计800m²。	水泥混凝土路面(强度等级:C25,厚度:18cm)769m²,排水沟开挖243米,安装自来水274户
71	滕州市	官桥镇	滕州市-官桥镇 村基础设施 2022年度滕州市官桥镇道路硬化建设项目(第二批)枣庄	计划实施吕楼村1504平方米,后官庄村507平方米,前掌大村2050平方米,马庄村2008平方米,共计6069平方米。	吕楼村1513.648平方米,后官庄村526.293平方米,前掌大村2110.3平方米,马庄村1887.5平方米,共计6037.941平方米。
72	滕州市	官桥镇	滕州市-官桥镇 村基础设施 2022年度滕州市官桥镇道路硬化建设项目(第二批)枣庄	通过衔接资金的支持补助该村修建5米宽道路长约282.2米,3米宽道路长约63.5米;4米宽道路长约197米。项目总投资23万元,其中,枣庄市衔接资金23万元。	新建2444平方米水泥路面
73	滕州市	官桥镇	滕州市-官桥镇 村基础设施 2022年度滕州市官桥镇史庄村第一书记道路硬化项目(第二批)枣庄	通过衔接资金的支持补助该村修建6米宽道路约158米,硬化4米宽道路约775米的水泥路面,解决老百姓出行难题。项目总投资40.9万元,其中:枣庄市衔接资金40万元,不足部分由村级自筹。	新建4591.4275平方米水泥路面
74	滕州市	官桥镇	滕州市-官桥镇 村基础设施 2022年度滕州市官桥镇梁村第一书记道路硬化项目(第二批)枣庄	通过衔接资金的支持补助该村修建规划内自来水管网配套设施(水表除外)全部重新铺设更新提升。项目总投资45.9万元,其中:枣庄市衔接资金40万元,不足部分由村级自筹。	完成自来水管网建设2545.8米及配套设施
75	滕州市	级索镇	滕州市-级索镇 乡村建设行动 农村基础设施(含产业配套基础设施) 2022年度滕州市级索镇梁庄村第一书记道路硬化及配套设施建设项目(第二批)枣庄	1、道路硬化工程。计划对梁庄村南北向主干道进行拓宽硬化,道路总长度510米,拓宽2.1米,混凝土硬化厚度0.15米,总计硬化面积1281平方米。 2、新建排水沟工程。新建路两侧排水沟1070米,排水沟维修加宽砼盖板120米。 以上具体工程量,以实际设计建设标准为准。	在梁庄村共计划硬化道路1201.725平方米,新建排水沟1067.4米,修复排水沟151.7米
76	滕州市	级索镇	滕州市-级索镇 乡村建设行动 农村基础设施(含产业配套基础设施) 2022年度滕州市级索镇道路硬化及配套设施项目(第二批)枣庄(28.46,省1.21)	1、董庄村道路硬化工程。计划对董庄村南部,东西走向生活道路进行硬化,其中,路长676米、路宽3.6米、硬化厚度0.15米,硬化面积2433.6平方米。 2、后王庄村排水沟建设工程。计划对后王庄村南北走向中心路北段,道路两侧排水沟进行建设,其中,新建排水沟420米,机械破碎恢复砼路面62平方米,排水沟盖板规格长0.8米、宽0.5米、厚0.08米。 3、前牛集村排水沟建设工程。计划对前牛集村南北部分路段,道路两侧排水沟进行建设,其中,新建排水沟732米,排水沟不覆盖砼盖板。 5、后杨岗村道路硬化工程。计划对后杨岗村东首,南北走向村内生活道路北段进行硬化,其中,4米宽路长72.7米,3米宽路长109.5米,硬化面积619.3平方米 以上工程具体工程量,以实际设计建设标准为准。	1、董庄村道路硬化工程。董庄村南部,东西走向生活道路进行硬化,硬化厚度0.15米,硬化面积2385平方米。 2、后王庄村排水沟建设工程。后王庄村南北走向中心路北段,道路两侧排水沟进行建设,其中,新建排水沟423.2米,机械破碎恢复砼路面86平方米,排水沟盖板规格长0.8米、宽0.5米、厚0.08米。 3、前牛集村排水沟建设工程。对前牛集村南北部分路段,道路两侧排水沟进行建设,其中,新建排水沟751米,排水沟不覆盖砼盖板。 5、后杨岗村道路硬化工程。对后杨岗村东首,南北走向村内生活道路北段进行硬化,硬化面积612.2平方米。
77	滕州市	姜屯镇	滕州市-姜屯镇 村基础设施 2022年度滕州市姜屯镇同西村枣庄市派第一书记自来水管改造提升道路硬化项目(第二批)枣庄	1.村主干道自来水管网升级改造项目 对村内2150米自来水管网重新铺设。 2.村内部分道路铺设柏油项目 对村内东西主干道中的前(南)街、中街共850米路面铺设柏油。	一是沥青路面。对同西村南街和中心街,两条东西走向生活道路进行沥青铺设,厚度7厘米,总长度868.8米、路宽4米,面积3476.2平方米。二是新建村内自来水管网。在南街、北街和南北地道,管道规格为DE50 PE管,长350米,DE50 PE管1732米,水表12块、水表池15个、阀门50个、管件一家。
78	滕州市	姜屯镇	滕州市-姜屯镇 村基础设施 2022年度滕州市姜屯镇同西村枣庄市派第一书记基础设施建设项目(第二批)枣庄	项目实施地点位于滕州市姜屯镇同西村,村水管网改造维修约11400米。	1、国标De90m, 900m; 压力1.3Mpa, 管道壁厚8.2mm。 2、国标De150m, 5100m; 压力1.0Mpa, 管道壁厚4.9mm。 3、国标De200m, 4800m; 压力1.0Mpa, 管道壁厚5.9mm。 4、国标De200m, 1530m; 压力1.6Mpa, 管道壁厚2.3mm。 5、阀门井水帘道+钢筋(带盖板)20座,规格80*60*40。6、机械人工开挖管沟,10000m。 7、开沟机, 8480m。 8、水表制式水表15口径, 346个。 9、除φ400预制水表检查井, 270个。 10、阀门、管件1.30、32、50、90阀门、直接、弯头三通,1项。 11、水泥路管沟回填、复铺, 1项。 12、其他零星工项
79	滕州市	姜屯镇	滕州市-姜屯镇 村基础设施 2022年度滕州市姜屯镇自来水管改造提升基础设施建设项目(第二批)枣庄	详见方案	张孔庄村: 主管道PPR国标50, 615米; 主管道, PPR国标32, 3885米; 阀门井40个; 水表井池188个; 智能水表188个; 配件弯头、直接、三通、截止阀等一套, 挖沟回填4732米, 水泥路面修复1项, 其他零星工项。庄里西村: 主管道, PE国标100级壁厚7.8mm, 400米; 次主管道, PE国标100级壁厚6.8mm, 500米; 次主管道, PE国标100级壁厚4.6mm, 1800米; 支管道, PE国标100级壁厚3.0mm, 1500米; 支管道, PE国标100级壁厚2.3mm, 2500米; 入户管, PE国标100级壁厚2.3mm, 2000米; 配件: 弯头、直接、三通、截止阀等一套; 入户智能表251块; 巷口智能表4块; 水表池251个(80*80*40); 挖沟回填3000米; 巷口、户门口修复1项; 其他零星工项。孙村: 开挖回填410米; 砌块410米; 垫层410米, 厚平均0.05米; 砼标号C20; 抹灰410米; 其他费用410米。
80	滕州市	界河镇	滕州市-界河镇 村基础设施 2022年度滕州市界河镇刘岗村枣庄市派第一书记基础设施建设项目(第二批)枣庄	刘岗村项目实施地点为水塔南道路、前街小学道路,道路硬化面积约4500平方米,厚度约15cm,使用C25水泥混凝土,切割留缝,包含路基整平压实。	刘岗村新建道路4454m²,厚度约15cm,使用C25商混
81	滕州市	界河镇	滕州市-界河镇 村基础设施 2022年度滕州市界河镇北岗楼村枣庄市派第一书记基础设施建设项目(第二批)枣庄	项目实施地点位于界河镇北岗楼村,主要为安装34盏路灯,开挖村南北下水管道约300米,建设标准参照大湖10个。	北岗楼村建设完成蔬菜大棚6个,新修排水管道 470米,安装路灯 33 套
82	滕州市	界河镇	滕州市-界河镇 村基础设施 2022年度滕州市界河镇道路提升、危桥改造项目实施方案(第二批)枣庄	1、北界河村危桥改造。桥长6米,宽3米,水泥定点浇筑,预算约20万元。 2、葛庄村道路硬化。硬化厚度15厘米,硬化路面面积约600平方米。预算约9万元。 3、二十里铺村危桥改造。桥斜长4米,宽4米,水泥定点浇筑。预算约12万元。 4、西安楼村道路提升。村南大街主干道修建排水沟,安装太阳能路灯90套。预算约35万元。 以上具体工程量,以实际设计建设标准为准。	1、北界河村建设完成规格6米*3米新桥一座; 2、葛庄村完成道路硬化602平方米; 3、二十里铺村建设完成规格4米*4米新桥一座; 4、西安楼村建设完成内径0.4米,高0.6米规格下水道640米,安装太阳能无杆路灯71套,太阳能单杆路灯22套,共 93 套



83	滕州市	荆河街道	滕州市-荆河街道 村基础设施 2022年度滕州市荆河街道小南河后道疏浚及配套设施项目(第二批)	计划硬化总面积1688㎡,下水道110米.	硬化总面积1718.07㎡,下水道109.3米,砖检查井4座
84	滕州市	龙阳镇	滕州市-龙阳镇 村基础设施 2022年度滕州市龙阳镇大陈庄村第一书记书记大口井及灌溉设施建设项目(第一批)	主要内容内容包括修建内径20cm大口井1座,铺设DN80PE管道1.15km,水泵及其配套2台,智能机房及其配套电气设备3间,给排水13个,给水池13个.	项目建设深20cm大口井1座, DN80PE管道1.15km,水泵及其配套2台,智能机房及其配套电气设备2套, 给排水13个, 给水池13个.
85	滕州市	龙阳镇	滕州市-龙阳镇 村基础设施 2022年度滕州市龙阳镇史村第一书记书记大口井及灌溉设施建设项目(第一批)	项目实施地点位于龙阳镇史村,项目涉及主要工程内容修建村内下水道:长2000余米、宽0.7米、深0.5米-0.6米.	项目硬化道路厚15cm,混凝土标号:C20,面积320.2㎡;建设盖板式下水道1150.7m、砼管式下水道458m.
86	滕州市	龙阳镇	滕州市-龙阳镇 村基础设施 2022年度滕州市龙阳镇耿庄村道路硬化建设项目(第二批)	项目建设内容对耿庄村部分入户道路进行硬化,硬化厚度15厘米,计划硬化路总长度1200米、路宽3-5米,硬化面积4500平方米.	项目硬化混凝土标号:C25,道路厚15cm、面积4748.35㎡.
87	滕州市	木石镇	滕州市-木石镇 村基础设施 2022年度滕州市木石镇振兴村道路硬化及下水道维护第一书记项目(第二批)	(1)砌垒加盖板,深1.5米宽1米建设长度240米,预算价204000元。 (2)安装30瓦128盏太阳能路灯,费用约70000元。 (3)新建80立方储水设施及管道安装,基础为毛石砌垒6米(长)*5米(宽)*0.5米(高)费用约134800元。	砌垒加盖板、安装太阳能路灯、新建储水设施及管道安装,太阳能路灯120套(A字臂、灯头功率40瓦、配30瓦太阳能板、54AH磷酸铁锂电池);混凝土管45.5m,12cm厚排水沟盖板39.65m;80m³蓄水池一个,塑料进出水管41.5m.
88	滕州市	木石镇	滕州市-木石镇 村基础设施 2022年度滕州市木石镇独前村饮水管网改造第一书记项目(第二批)	重新铺设全村饮水管网约6500米(主管网约1800米,分户管网约4700米)	完成自来水安装348户,包括管网开挖、埋设塑料管、安装水表及配套设施等建设内容。
89	滕州市	木石镇	滕州市-木石镇 村基础设施 2022年度滕州市木石镇独前村路灯安装项目(第二批)	在南山头村、南涝坡村、化石沟村、前安村、中安村安装55W立杆太阳能路灯约332盏,其中南山头村安装约90盏,南涝坡村安装约75盏,化石沟村安装约90盏,前安村安装约35盏,中安村安装约42盏.灯杆高约6米,≥55w太阳能板,≥55wLED灯珠,每盏造价约1300元,具体工程量,以实际设计建设标准为准.	共安装55w立杆太阳能路灯318盏,其中南山头村90盏、化石沟村90盏、前安村28盏、中安村31盏、南涝坡村79盏.
90	滕州市	南沙河镇	滕州市-南沙河镇 产业发展 加工流通项目 南沙河镇上营村钢结构厂房项目(第二批)	南沙河镇政府统筹上营村村级衔接资金,利用上营原村委会空闲地,建造50m*30m钢结构厂房用于出租.	上营钢结构厂房项目共建设50m*28m厂房1300平方米,实际
91	滕州市	南沙河镇	滕州市-南沙河镇 乡村建设 农村基础设施(含产业配套设施) 南沙河镇2022年度道路硬化及排水设施建设项目(第二批)	对南沙河镇冯西村实施道路硬化建设项目,预计道路硬化2000平方,对南沙河镇冯西村新建排水设施640米.	使用衔接资金30万元对冯西村和冯西村实施道路硬化及排水设施建设项目,硬化道路2000平方米,新建排水沟640米.
92	滕州市	南沙河镇	滕州市-南沙河镇 乡村建设 农村人居环境整治 2022年度滕州市南沙河镇冯西村第一书记书记农村人居环境整治项目(第二批)	南沙河镇冯西村第一书记书记农村人居环境整治项目,项目整治范围内河道全长约110m,项目拟对项目区域河道两岸进行生态护坡.生态护坡长度约230m,宽度约8m*16m.	使用衔接资金40万元实施冯西村冯西村农村人居环境整治项目,新建排水沟500.10米(内径30CM,内径深40CM,盖板钢筋厚8CM,砼层厚5CM,含盖板及恢复,含水表拆除及修复),预制管铺设49.00米(规格:DN600,检查井砌筑).
93	滕州市	西岗镇	滕州市-西岗镇 产业项目 2022年度滕州市西岗镇冯庄村第一书记项目大棚建设项目(第二批)	项目实施地点位于西岗镇冯庄村老村址复垦地,土地性质为一般用地,计划建设高标准冬暖大棚两座.大棚主要以热镀锌管材料为骨架,包含保温系统、通风系统等.根据现场情况计划建设一个面积约2600平方米大棚,包括通道及其它附属设施共占地3200平方米.	大棚顶高6米,宽21.5米,一个棚长94.5米,一个棚长56.5m 共计2601.5平方.
94	滕州市	西岗镇	滕州市-西岗镇 村基础设施 2022年度滕州市西岗镇冯庄村第一书记项目道路硬化项目(第二批)	西岗镇道路硬化项目涉及4各村,硬化厚度15厘米,其中,段庄村4条小巷长度约570米,宽2.8米,面积约1596平方米;东祝陈村小巷长度约190米,宽4米,面积约760平方米;东南田岗村小巷长度约180米,宽4米,面积约720平方米;丁董村内道路长300米,宽4米,面积约1200平方米,硬化路总长度1240米、硬化面积4278平方米.	西岗镇道路硬化项目涉及4各村,硬化厚度15厘米,其中,段庄村面积约154.28平方米;东祝陈村面积约925.2平方米;东南田岗村面积约851.3平方米;丁董村面积约1269.5平方米;硬化路总面积4600.28平方米.
95	滕州市	羊庄镇	滕州市-羊庄镇 乡村建设 农村人居环境整治 2022年度滕州市羊庄镇第一书记书记农村人居环境整治项目(第二批)	(一)建设内容 项目实施地点位于羊庄镇南于村,主要打通村内断头路10条,硬化道路总长度约1040米。 (二)投资规模、资金来源、衔接资金具体使用方式 1、投资规模:经测算,预计投资约40万元。 村内道路硬化工程:村内硬化多条断头路,硬化总长度约1040米,宽度2-4.5米不等,厚度15-20厘米,水泥石灰C25,路面平整、砂石基层、混凝土浇筑、养护、砌缝等,预计造价40万元。	羊庄镇南于村内硬化10条断头路,硬化总长度约1040米,宽度2-4.5米不等,硬化厚度15-20厘米,路面平整、砂石基层、混凝土浇筑、养护、砌缝等,混凝土强度等级为C25,面积为2250平方米,土方回填5828立方米.项目估算总计价400011元.
96	滕州市	羊庄镇	滕州市-羊庄镇 乡村建设 农村人居环境整治 2022年度滕州市羊庄镇第一书记书记农村人居环境整治项目(第二批)	1、道路硬化:硬化路总长度约1400米,宽度3-4米不等,硬化厚度15厘米,硬化面积约6055平方米,其中:大北塘村1117平方米,后毛垵村858平方米,范西村787平方米,范东村787平方米,西于村1107平方米,蒋坑村339平方米。 2、自来水提升工程:覆盖黄屯村130户,铺主管1800米,支管3500米,切割并修复路面3200米。 3、路灯安装工程:在羊东村安装高杆规格路灯40盏,前台村安装23组400瓦LED灯和光伏板路灯。 以上具体工程量,以实际施工建设标准为准。(二)投资规模及资金来源 计划投资金额103.79万元.其中使用2022年度财政衔接推进乡村振兴补助资金70万元,2021年结余资金9.140835万元,剩余资金村级自筹,计划投资金额86.99万元.	1.羊庄镇前台村安装30瓦LED灯和光伏板路灯共23组,项目估算总计价13847.38元.2.羊庄镇羊东村安装高杆规格80瓦路灯40盏,项目估算总计价133088.4元.3.羊庄镇黄屯村自来水提升工程,覆盖黄屯村共130户,铺主管1800米,支管3500米,切割并修复路面3200米,项目估算总计价28391.35元.4.羊庄镇西于村道路硬化10米,厚度15厘米,混凝土强度等级为C25,工程总面积约1153.41平方米.项目估算总计价134533.74元.5.羊庄镇范西村道路硬化工程,厚度15厘米,混凝土强度等级为C25,工程总面积约826.98平方米.项目估算总计价96458.95元.6.羊庄镇范东村道路硬化工程,厚度15厘米,混凝土强度等级为C25,工程总面积约743.22平方米.项目估算总计价80889.18元.7.羊庄镇大北塘村道路硬化工程,厚度15厘米,混凝土强度等级为C25,工程总面积约1012.55平方米.项目估算总计价118103.83元.8.羊庄镇后毛垵村道路硬化1米,厚度15厘米,混凝土强度等级为C25,工程总面积约775.42平方米.项目估算总计价90444.99元.9.羊庄镇蒋坑村道路硬化工程,厚度15厘米,混凝土强度等级为C25,工程总面积约325.2平方米.项目估算总计价37991.33元.
97	滕州市	张庄镇	滕州市-张庄镇 产业发展 生产项目 2022年度滕州市张庄镇第一书记书记钢结构厂房建设项目(第二批)	张庄镇北李庄村第一书记书记衔接资金40万元,用于村西高路路北的建设用地,自建预计长30米,宽24米,高8米钢结构厂房,建筑面积约720平方米,为规范厂房,厂房以租赁形式使用,具体手续按照相关政策要求办理.	项目新建长30.5米,宽24.4米,檐高8米钢结构厂房,建筑面积约744.2平方米
98	滕州市	张庄镇	滕州市-张庄镇 乡村建设 农村人居环境整治 2022年度滕州市张庄镇第一书记书记农村人居环境整治项目(第二批)	新建村内道路长850米,宽4米,厚度18CM.	新建村内一条东西道路3197.2平方米
99	滕州市	张庄镇	滕州市-张庄镇 乡村建设 农村人居环境整治 2022年度滕州市张庄镇第一书记书记农村人居环境整治项目(第二批)	1、全村自来水主管道及预计230户住宅自来水到户管道进行新建;	自来水工程提升245户
100	薛城区	周营镇	2022年薛城区周营镇冯湖村现代农业产业园二期项目	计划利用2022年上级衔接资金430万元,在薛城区衔接乡村振兴集中推进区内冯湖村新建14个蔬菜大棚以及配套设施,其中建设冬暖日光温室10个(单个规格为长85米、宽13米、顶高5.2米。)及保温拱棚4个(其中两个规格为长110米、宽18米、顶高5.3米,两个规格为长95米、宽15米、顶高4.8米。),建设大棚配套设施.	5座冬暖日光温室,单个规格为长85米、宽13米、顶高5.2米;3座冬暖日光温室,单个规格为长92米、宽13米、顶高5.2米;1座冬暖日光温室,单个规格为长75米、宽13米、顶高5.2米;1座冬暖日光温室,单个规格为长40米、宽13米、顶高5.2米;1座保温拱棚,单个规格为长57米、宽13米、顶高4.8米;2座保温拱棚,单个规格为长55米、宽13米、顶高5.3米;1座保温拱棚,单个规格为长110米、宽18米、顶高5.3米.15座大棚配套设施及水电路等相关配套设施.
101	薛城区	沙沟镇	薛城区沙沟镇2023年智慧物流仓储项目(1)	在东界沟村废弃小学校新建标准厂房约1800平方米及配套设施(围墙、大门、厂区道路、看护房、卫生间).	在东界沟村废弃小学校新建钢结构厂房1938.48平方米及配套设施(围墙、大门、厂区道路、化粪池及雨水系统).对《竣工结算审核报告》(编号:鲁东汇龙造价【2022】第053号)予以认定,项目资产权属属于东界沟村、西界沟村、古庄村、南常西村、戴庄村、南常东村、茶棚村、甄井村、杜塘村、殷庄村10个村.
102	薛城区	周营镇	2022年薛城区周营镇冯湖村现代农业产业园二期项目	沙河涯村主干道沥青硬化,长度为1.2公里,宽度为6米,厚度为6厘米.	沙河涯村主干道沥青硬化,面积为13470平方米,厚度为4厘米.

103	薛城区	周营镇	2022年薛城区周营镇石门村第一书记衔接资金项目	1. 村内混凝土路面铺设面积约4200㎡。 2. 村内生产路铺设起爆料。所涉及生产路为村南生产路南北路四条，共计4100m，路面厚度15cm。	1. 村内混凝土路面铺设面积约4200㎡。2. 村内生产路铺设起爆料。所涉及生产路为村南生产路南北路四条，面积13250㎡
104	薛城区	周营镇	2022年薛城区周营镇石门村道路硬化基础设施项目	生产路混凝土路面硬化3055平方米，村内户户通道路混凝土路面硬化720平方米，厚度均为15厘米。	生产路混凝土路面硬化3802.05平方米，村内户户通道路混凝土路面硬化1113.99平方米，厚度均为15厘米。
105	薛城区	周营镇	2022年薛城区周营镇石门村第一书记衔接资金项目	生产路硬化为底道水—王林桥，张腾飞冬暖棚—养牛场北世行路，厚18cm，共计3720平方米。村内户户通混凝土路面厚度15厘米，共计面积924.4平方米。	生产路硬化为底道水—王林桥，张腾飞冬暖棚—养牛场北世行路，厚18cm，共计3720平方米。村内户户通混凝土路面厚度15厘米，共计面积924.4平方米。
106	薛城区	周营镇	2022年薛城区周营镇石门村第一书记衔接资金项目	1. 石门村南北中心路北尽头向北至薛城区殡仪馆门前东西路约920米，中间向东一条生产路约160米，共长约1080米，修建宽度3.8米，厚度15cm的混凝土生产路，共4104平方米。2. 大石门自然村与小石门自然村之间生产路，也是两个自然村之间通行道路，长度约310米，修建宽度2米，厚度16cm的混凝土生产路，共620平方米。	1. 石门村南北中心路北尽头向北至薛城区殡仪馆门前东西路，长度923.4米，平均宽度3.89米，厚度15厘米，两头喇叭口按照梯形面积单独计算。面积3661.98平方米。中间向东一条生产路，长度109.8米，平均宽度3.2米，厚度15厘米，两头喇叭口按照梯形面积单独计算。面积347.86平方米。2. 大石门自然村与小石门自然村之间生产路，也是两个自然村之间通行道路，长度390.9米，平均宽度2.19米，厚度15厘米，喇叭口面积单独计算。面积640.12平方米。
107	薛城区	常庄街道	2022年薛城区常庄街道寨村冷藏库建设项目	计划建设总建筑面积约180平方米的冷藏库。	实际完成总建筑面积约180平方米的冷藏库。
108	薛城区	常庄街道	2022年薛城区常庄街道寨村第一书记衔接资金项目	计划生产路提升改造修缮、下水道铺设。涉及村内5条道路，约800余米。铺设下水道位于村北九龙泉路，约150米。计划建设一座冷藏库含冷库体保温、制冷系统、系统安装、运费、配套设施等。	实际完成生产路提升改造修缮、下水道铺设。涉及村内5条道路，约800余米。铺设下水道位于村北九龙泉路，约150米。实际完成建设一座冷藏库含冷库体保温、制冷系统、系统安装、运费、配套设施等。
109	薛城区	常庄街道	2022年薛城区常庄街道埠岭山村冷库建设项目	计划建设冷藏库一座含冷藏库、用地测绘费用、地坪土建、冷藏库机组基础建设平台、冷藏库外钢结构支撑、冷藏库遮阳棚、机组电控箱以上电源、配套操作间等。	实际建设冷藏库一座含冷藏库、用地测绘费用、地坪土建、冷藏库机组基础建设平台、冷藏库外钢结构支撑、冷藏库遮阳棚、机组电控箱以上电源、配套操作间等。
110	薛城区	沙沟镇	2022年薛城区沙沟镇郭洼村道路提升项目	1. 污水管道工程：计划自村民郭修华-郭新旺-王正坤-王桂岭-刘宝田-秦家鹏-王桂岭家院前安装排污管道1260米，包括破路、开挖、回填、铺设排污管道、商混修复、检查井、沉淀池等。2. 道路提升工程：计划对郭洼村村内长度约450米、宽度约4米，共1800平方米路面（老李俊-王纯福-王桂岭-李西豹）进行沥青铺设。	安装排污管道1260米，包括破路、开挖、回填、铺设排污管道、商混修复、检查井、沉淀池；铺设沥青路面2120平方米，厚度40mm。
111	薛城区	沙沟镇	2022年薛城区沙沟镇岩湖村道路硬化提升项目	岩湖村道路硬化提升工程：对岩湖村村内道路加宽约1584平方米（厚度150cm）；硬化道路1760平方米（厚度150cm）；对其中3000平方米不规则路面进行沥青铺设（厚度40mm），修880米水泥管排水道。	岩湖村加宽硬化道路2387.64平方米，厚度150mm，铺设沥青路面4519.96平方米，厚度40mm。水泥下水管道632.6米。
112	薛城区	陶庄镇	2022年薛城区陶庄镇后湾村第一书记衔接资金项目	1. 铺设村内道路4777㎡；2. 安装路灯160盏/套。	铺设沥青道路5302㎡；安装太阳能路灯162盏，其中含支架、灯杆149盏，不含灯杆、含支架13盏。
113	薛城区	陶庄镇	2022年薛城区陶庄镇前院山村第一书记衔接资金项目	1. 铺设市场道路6900㎡；2. 铺设村内道路2630㎡。	铺设沥青市场道路825㎡，厚度4cm；村内铺设沥青路面2595.37㎡，厚度4cm。
114	薛城区	陶庄镇	2022年薛城区陶庄镇奚村第一书记衔接资金项目	1. 铺设村内道路6640㎡；2. 安装路灯46盏/套。	铺设沥青路面5214.42㎡，厚度4cm；太阳能路灯42盏，广场灯4盏。
115	薛城区	常庄街道	2022年薛城区常庄街道宋庄村基础设施建设项目	计划利用村内闲置建设用地建设农贸市场，市场占地约2000平方米，其中顶棚覆盖面积约1500平方米，顶棚覆盖区域下设水泥台面。	实际完成利用村内闲置建设用地建设农贸市场，市场占地约2000平方米，其中顶棚覆盖面积约1500平方米，顶棚覆盖区域下设水泥台面。
116	薛城区	邹坞镇	2022年薛城区邹坞镇庄头村基础设施建设项目	1. 村内沥青铺设：长1020米*宽4米（含15个排水管和地漏）。2. 安装路灯共122盏（其中有站杆的72盏、不带站杆50盏）。	1. 村内沥青铺设4197.12㎡（含22个排水管和地漏）；2. 安装路灯共120盏（其中有站杆的70盏、不带站杆50盏）。
117	薛城区	邹坞镇	2022年薛城区邹坞镇西南村基础设施建设项目	1. 村内主干道铺设沥青路面：长度约1500米、宽度约4米；2. 村内小巷水泥路长度约400米、宽度约3米。	1. 村内主干道铺设沥青路面共计5829.93m；2. 村内小巷水泥路15cm厚共计603.9m。
118	薛城区	邹坞镇	2022年薛城区邹坞镇东防各村基础设施建设项目	东防各村村内两条生产路铺设水泥路面，分别为：长约900米、宽约4米，厚15厘米；长约300米、宽约3米，厚15厘米。	东防各村村内两条生产路铺设水泥路面厚15厘米，共计4517.39平方米，平整场地4517.39平方米。
119	薛城区	新城街道	2022年薛城区新城街道黑峪村基础设施建设项目	村内破损水泥路铺设沥青路面，长度约201米、宽度约4.2米。两条生产路铺设水泥路面，一条长度约430米，宽度约2.5米；一条长度约970米，宽度约3米。	实际铺设沥青路面208米，854平方米。铺设两条水泥路面1385.5米，4228.46平方米。
120	薛城区	周营镇	2022年薛城区周营镇陶官庄村第一书记衔接资金项目	1. 陶官村：混凝土硬化，店韩路至堵刚家庭农场905平方米，18厘米厚。2. 蔡官庄村：沥青硬化3574平方米，4厘米厚。包括李庆庆户至王家凤凰后183平方米；王家凤凰后至变压器467.4平方米；变压器至韩路292.6平方米。	陶官村混凝土硬化984.23平方米，18厘米厚；蔡官庄村沥青硬化3338.5平方米，4厘米厚。
121	薛城区	陶庄镇	2022年薛城区陶庄镇衔接资金基础设施项目	1. 东仓村供水主管网过河；2. 大南庄供水主管网提升改造。	在大南庄村安装供水主管网DN110 PE管、弯头，DN100闸阀、水表等。在东仓村安装供水过河160PE管、160顶管、阀门井盖等。
122	薛城区	周营镇	2022年薛城区周营镇铁佛村桥梁建设基础设施项目	在铁佛村椿林自然村新建桥梁一座，长20米宽3米。	在铁佛村椿林自然村新建桥梁一座，两跨桥为浆砌块石桥墩、钢筋混凝土桥面，桥身跨5m，桥面净宽3m（全宽6.0m）；主桥全长12.2m，引桥长5.4m，桥护净长10.8m，宽11m，护坡长7.6m。
123	薛城区	底阁镇	2022年度底阁镇第一书记帮包村基础设施项目	总面积约18780.3平方米。其中：底阁村水泥路面积约1863.75平方米，沥青路面面积约2850平方米，官庄村总面积约4915.5平方米；望台村总面积约4211.5平方米；更鸡岭村总面积约1053.57平方米；前岳城村面积约1082平方米；周庄村面积约1058平方米；后具村面积约1058平方米	铺设15cm厚水泥路14033.584㎡、4cm厚沥青路6900㎡。其中：底阁村铺设15cm厚水泥路1978.98㎡、4cm厚沥青路3980㎡；官庄村铺设15cm厚水泥路3141.80㎡、4cm厚沥青路1580㎡；望台村铺设15cm厚水泥路4315.745㎡；更鸡岭村铺设15cm厚水泥路1214.911㎡；前岳城村铺设15cm厚水泥路1144.027㎡；周庄村铺设15cm厚水泥路1126.591㎡；后具村铺设15cm厚水泥路1110.53㎡
124	薛城区	峨山镇	2022年度峨山镇现代畜牧业三产融合示范基地项目	1. 养牛棚3座，长88m、宽28m、高4.5m的养牛棚3座（1-3号），长77m、宽26m、高4.5m的养牛棚3座（4-6号）；2. 饲料仓库1座，长36m、宽30m、高4.5m；3. 青储池1处，长18m、宽18m、高7m；4. 生活用房1处，长30m、宽6m、高3.5m；5. 硬化基地内部道路面积5000平方米、厚度15cm；6. 围墙：850立方米（最终工程量及金额以项目决算审计为准）。	新建养牛场一处：1. 养牛棚3座，长88m、宽28m、高4.5m的养牛棚3座（1-3号），长77m、宽26m、高4.5m的养牛棚3座（4-6号）；2. 饲料仓库1座，长36m、宽30m、高4.5m；3. 青储池1处，长18m、宽18m、高7m；4. 生活用房1处，长30m、宽6m、高3.5m；5. 硬化基地内部道路面积5000平方米、厚度15cm；6. 围墙：850立方米；
125	薛城区	吴林街道	2022年度吴林街道第一书记帮包村基础设施建设项目	总面积约10387平方米。其中：大埭村面积约852平方米；小屯村面积约834平方米；肖桥村面积约3493平方米；大李楼村面积约3508.35平方米；七里店村面积约835平方米；垌子村面积约795平方米。	铺设15cm厚水泥路总计10415.78㎡。其中：肖桥村铺设15cm厚水泥路3494.58㎡；大李楼村铺设15cm厚水泥路3508.35㎡；垌子村铺设15cm厚水泥路818.06㎡；七里店村铺设15cm厚水泥路837.97㎡；大埭村铺设15cm厚水泥路863.3㎡；小屯村铺设15cm厚水泥路863.52㎡
126	薛城区	榴园镇	2022年度榴园镇第一书记帮包村基础设施建设项目	总面积约10946.35平方米。其中：韩楼村面积约3084.5平方米；卜村面积约780平方米；曹马村面积约877平方米；关山口村面积约500平方米；贾泉村面积约843.1平方米；七里山村面积约975平方米；前光庄村面积约1040平方米；西梁村面积约835.5平方米；糜村面积约1011.25平方米。	铺设15cm厚水泥路总计12844.06㎡。其中：韩楼村铺设15cm厚水泥路4281.60㎡；卜村铺设15cm厚水泥路1092.29㎡；曹马村铺设15cm厚水泥路1086.91㎡；关山口村铺设15cm厚水泥路1063.41㎡；贾泉村铺设15cm厚水泥路1086.93㎡；七里山村铺设15cm厚水泥路1060.35㎡；前光庄村铺设15cm厚水泥路1052.83㎡；西梁村铺设15cm厚水泥路1041㎡；糜村铺设15cm厚水泥路1105.74㎡

127	峰城区	阴平镇	2022年度阴平镇第一书记帮包村基础设施项目	总面积18000平方米。其中：菜园村面积约1000平方米；东金庄村计划面积约1000平方米；吴家坡村约3米*3米*5厘米的规格式沥青、硬化水泥路面2.5米*8米*1米；西金庄村面积约903平方米；斜屋村面积约1000平方米；燕庄村面积约1000平方米；朱沟村面积约4000平方米；尚庄村总面积约5000平方米；西楼村铺设5厘米的规格式沥青路面及相关配套设施建设。	铺设水泥路10228.46㎡、铺设5cm厚沥青路面6520.92㎡、砌筑井15个、砌筑方沟72.5m。其中：(1)西金庄村铺设15cm厚水泥路51.57㎡；(2)西楼村铺设5cm厚沥青路面440.92㎡；(3)朱沟村铺设5cm厚水泥路388.23㎡；(4)斜屋村铺设12cm厚水泥路23.1㎡；(5)东金庄村铺设18cm厚水泥路72.5m；(6)燕庄村铺设15cm厚水泥路920.95㎡；(7)尚庄村铺设12cm厚水泥路5190.36㎡；(8)吴家坡村铺设5cm厚沥青路面1080㎡；(9)菜园村铺设12cm厚水泥路1117.36㎡；(10)西楼村铺设12cm厚水泥路3257.11㎡；(11)斜屋村铺设15cm厚水泥路1088.4㎡；(12)燕庄村铺设12cm厚水泥路9.28㎡；(13)朱沟村铺设15cm厚水泥路743.12㎡；(14)东金庄村铺设15cm厚水泥路281.21㎡；(15)西楼村铺设15cm厚水泥路43.16㎡；(16)砌筑井1座。
128	峰城区	古邵镇	2022年度古邵镇朱园村现代农业示范园二期项目	新建130米*15米冬暖温室大棚4座，120米*15米冬暖温室大棚3座，平均100米*15米冬暖温室大棚8座，扩建平均70米*12.5米冬暖温室大棚6座；硬化配套道路约5100平方米；大棚配套附属设施。具体金额以项目决算审计为准。	新建21座冬暖温室大棚(其中130米*15米大棚3座、120米*15米大棚3座、100米*15米大棚1座、107米*15米大棚1座、103米*15米大棚1座、91米*15米大棚1座、88米*15米大棚1座、84米*15米大棚1座、73米*15米大棚1座、69米*15米大棚1座、64米*15米大棚1座、59米*15米大棚1座、57米*15米大棚1座，合计新建冬暖温室大棚21座)；新建看护房21座；在园内铺设配套道路15cm厚水泥路4877㎡。
129	峰城区	古邵镇	2022年度古邵镇第一书记帮包村基础设施项目	硬化花园村、曹庄村村内道路各4000平方米；邱庄村、小安村、文堆村、张庄村、沙口村、武寺村、洛庄村、瓦屋村、范庄村、郝湖村、东官村、八里沟村、马庄村、小韩庄村内道路各1000平方米。	硬化14cm厚水泥路总面积为19701.94㎡，其中花园村4507.55㎡，邱庄村1176.22㎡，小安村1145.95㎡，文堆村1125.8㎡，张庄村1138.6㎡，沙口村1274.75㎡，武寺村1128.91㎡，洛庄村1203.3㎡，瓦屋村1203.6㎡，范庄村1264.45㎡，郝湖村1220.66㎡，东官村1128.14㎡，八里沟1132.4㎡，小韩村1125.37㎡，硬化18cm厚水泥路总面积为3613.72㎡，其中曹庄村3613.72㎡；硬化10cm厚水泥路总面积为1533㎡，其中马庄村1533㎡。
130	峰城区	古邵镇底园镇阴平镇南园镇张林街街道	2022年度峰城区高质高效农业项目	1、钢结构大棚及配套设施：144个钢结构大棚，约41238平方米；硬化20cm厚园区道路约4526平方米；铺设10cm厚石渣路约4535平方米；2米高金属围栏约2074米；深水井1眼及配套，47套消防设施，变电所房1座、变压器1台及配套。2、恒温库房及配套设施：1600平方米钢结构恒温库房，恒温库厂区大门1个；地磅1套，3、1060平方米钢结构分选车间。4、472平方米钢结构农机仓库(包装车间)。最终工程量及金额以项目决算审计为准。	新建134个钢结构大棚，总面积41166平方米；硬化20cm厚混凝土道路约4465.94平方米，铺设10cm厚石渣路约1880.75平方米。2米高金属围栏约1831.86米，新打深水井1眼及配套；47套消防设施；变电所房1座、变压器1台及配套。恒温库房1座487.89平方米，恒温库厂区大门1个；地磅1套。分选车间1座1050.03平方米。农机仓库1座487.21平方米。桥1座(17米*11.4米)；恒温库房外设备基础及封网施工(3.85米*4.6米)。
131	台儿庄区	马兰屯镇	山东祥和乳业奶牛养殖合作项目	计划在祥和乳业公司养殖场内空闲地段，购买钢结构双面大牛舍1个	在祥和乳业公司养殖场内空闲地段，购买钢结构双面大牛舍1个
132	台儿庄区	马兰屯镇	南洛村村内道路硬化项目	硬化村内1组到6组主要道路，及胡庄中心路	硬化村内1组到6组主要道路，及胡庄中心路
133	台儿庄区	马兰屯镇	新楼村基础设施建设项目	硬化路面	硬化路面
134	台儿庄区	马兰屯镇	北河村基础设施建设项目	硬化运河北堤入村至村内路面	硬化运河北堤入村至村内路面
135	台儿庄区	马兰屯镇	南洛村基础设施提升项目	对南洛村内中心路面提升	对南洛村内中心路面提升
136	台儿庄区	涧头集镇	涧头集镇涧头村基础设施提升	完善村内道路等基础设施	完善村内道路等基础设施
137	台儿庄区	涧头集镇	涧头集镇姬楼村基础设施提升	姬楼村内道路硬化约4000平方米	姬楼村内道路硬化约4000平方米
138	台儿庄区	涧头集镇	涧头集镇张楼村基础设施提升	道路硬化约4000平方米	道路硬化约4000平方米
139	台儿庄区	涧头集镇	涧头集镇旺庄村基础设施	道路硬化约4000平方米	道路硬化约4000平方米
140	台儿庄区	涧头集镇	涧头集镇张楼村道路硬化	村内道路硬化约2700平方米	村内道路硬化约2700平方米
141	台儿庄区	涧头集镇	涧头集镇姬楼村道路硬化	村内道路硬化约1500平方米	村内道路硬化约1500平方米
142	台儿庄区	泥沟镇	2022年泥沟镇钢结构厂房项目	建设面积约2000平方米钢结构厂房。	建设面积约2000平方米钢结构厂房。
143	台儿庄区	泥沟镇	2022年泥沟镇董庄村冬暖式蔬菜大棚项目	建设1座约1552.5平方米冬暖式蔬菜大棚及配套设施	建设1座约1552.5平方米冬暖式蔬菜大棚及配套设施
144	台儿庄区	泥沟镇	2022年泥沟镇郭庄基础设施提升项目	建设水泥砼路面约4200平方米，修补水泥砼路面约520平方米，铺设沥青砼路面约1300平方米	建设水泥砼路面约4200平方米，修补水泥砼路面约520平方米，铺设沥青砼路面约1300平方米
145	台儿庄区	泥沟镇	2022年泥沟镇泥沟村道路提升项目	建设水泥砼路面约4800平方米	建设水泥砼路面约4800平方米
146	台儿庄区	泥沟镇	2022年泥沟镇郝湖村基础设施提升项目	建设水泥砼路面约4850平方米	建设水泥砼路面约4850平方米
147	台儿庄区	泥沟镇	2022年泥沟镇腰里徐处基础设施提升项目	修补水泥砼路面约705平方米，铺设沥青砼路面约3800平方米	修补水泥砼路面约705平方米，铺设沥青砼路面约3800平方米
148	台儿庄区	泥沟镇	2022年泥沟镇三付楼村道路硬化项目	建设水泥砼路面约3050平方米，铺设沥青砼路面约2060平方米	建设水泥砼路面约3050平方米，铺设沥青砼路面约2060平方米
149	台儿庄区	泥沟镇	2022年泥沟镇董子村基础设施提升项目	建设水泥砼路面约3600平方米	建设水泥砼路面约3600平方米
150	台儿庄区	泥沟镇	2022年泥沟镇姜坊村基础设施提升项目	建设水泥砼路面约1750平方米，修补水泥砼路面约740平方米，铺设沥青砼路面约2400平方米	建设水泥砼路面约1750平方米，修补水泥砼路面约740平方米，铺设沥青砼路面约2400平方米
151	台儿庄区	泥沟镇	2022年泥沟镇神树园村道路硬化项目	铺设村内沥青道路等基础设施建设	铺设村内沥青道路等基础设施建设
152	台儿庄区	郑庄镇	2022年度郑庄镇桥村基础设施建设项目	对郑沟桥村内道路硬化面积约2000平方米、铺设柏油路约900米、更换环村河三座桥栏杆等基础设施建设。	对郑沟桥村内道路硬化面积约2000平方米、铺设柏油路约900米、更换环村河三座桥栏杆等基础设施建设。
153	台儿庄区	郑庄镇	2022年度郑庄镇佛村基础设施建设项目	对前石佛村道路铺设柏油、修缮下水道等基础设施建设	对前石佛村道路铺设柏油、修缮下水道等基础设施建设
154	台儿庄区	郑庄镇	2023年度郑庄镇小李庄回新村基础设施建设项目	对小李庄村内东西三条主要道路进行铺设柏油2400平方米等基础设施建设	对小李庄村内东西三条主要道路进行铺设柏油2400平方米等基础设施建设
155	台儿庄区	郑庄镇	2022年度郑庄镇小李庄回新村基础设施建设项目	主要建设温室大棚一座	主要建设温室大棚一座
156	台儿庄区	郑庄镇	2022年郑沟桥村温室大棚建设项目	主要建设温室大棚一座	主要建设温室大棚一座
157	台儿庄区	运河街道	2022年度北园社区基础设施建设项目	水泥路面3000平方米下水道200米	水泥路面3000平方米下水道200米
158	台儿庄区	张山子镇	甜桃新品种培育基地建设工程	大力引进甜桃新品种，建设新品种引进种植示范园，配套完善张庄村、黄邱村2个村农业生产基础设施，改善甜桃种植区农业生产设施水平。该项目主要计划新建3米宽混凝土路3.4公里(葫芦套向南连接观景平台)、新打配套机电井3眼，铺设喷灌管道20000米，在新修道路两侧建设甜桃新品种示范园，区、镇出台甜桃新品种激励政策，力争三年内扩种甜桃新品种1000亩。	大力引进甜桃新品种，建设新品种引进种植示范园，配套完善张庄村、黄邱村2个村农业生产基础设施，改善甜桃种植区农业生产设施水平。该项目主要计划新建3米宽混凝土路3.4公里(葫芦套向南连接观景平台)、新打配套机电井3眼，铺设喷灌管道20000米，在新修道路两侧建设甜桃新品种示范园，区、镇出台甜桃新品种激励政策，力争三年内扩种甜桃新品种1000亩。
159	台儿庄区	张山子镇	高标准智慧肉牛养殖示范项目	为助力企业提升养殖能力，促进畜牧业高效发展、“一二三”产融合发展，与农乡农业科技有限公司合作，投入衔接资金199.4万元，购买标准化肉牛养殖大棚1个，带动农户发展肉牛养殖产业。同时，可为推进区内富余劳动力提供就业岗位60余个，多方面拓宽群众增收门路。	为助力企业提升养殖能力，促进畜牧业高效发展、“一二三”产融合发展，与农乡农业科技有限公司合作，投入衔接资金199.4万元，购买标准化肉牛养殖大棚1个，带动农户发展肉牛养殖产业。同时，可为推进区内富余劳动力提供就业岗位60余个，多方面拓宽群众增收门路。

160	台儿庄区	张山子镇	黄邱山桃花源精品环线旅游建设工程	铺设环尤窝子水库3米宽混凝土路面0.9公里；铺设4米宽混凝土路335米（磨石楼村南-葫芦套道路），铺设3米宽混凝土路1.8公里（磨石楼-张庄村大环线），沿线合理布局候车平台、观景平台、文化小品等旅游配套设施，打造黄邱山桃花源步行慢道、骑行绿道。	铺设环尤窝子水库3米宽混凝土路面0.9公里；铺设4米宽混凝土路335米（磨石楼村南-葫芦套道路），铺设3米宽混凝土路1.8公里（磨石楼-张庄村大环线），沿线合理布局候车平台、观景平台、文化小品等旅游配套设施，打造黄邱山桃花源步行慢道、骑行绿道。
181	台儿庄区	张山子镇	张山子镇大沟上村蔬菜种植大棚项目	建设高标准蔬菜种植大棚2个	建设高标准蔬菜种植大棚2个
182	台儿庄区	张山子镇	张山子镇唐庄村基础设施建设项目	道路硬化约5800平方米	道路硬化约5800平方米
183	台儿庄区	张山子镇	张山子镇歌山子村基础设施建设项目	新建自来水管28000米	新建自来水管28000米
184	台儿庄区	张山子镇	张山子镇社安村基础设施建设项目	道路硬化约2600平方米	道路硬化约2600平方米

序号	县区名称	乡镇名称	总项目名称	项目基本情况		
				项目内容	金额	人数
1	薛城区		公益岗位_2022年薛城区已脱贫享受政策和监测户公益岗位项目	为2022年薛城区已脱贫享受政策和监测户公益岗位提供补助	15	100
2	薛城区		公益岗位	对全区符合条件的425名脱贫享受政策人口和监测帮扶人口进行岗位补助，帮助就业增收	34.28	228
3	滕州市		滕州市_公益岗位_2022年度滕州市公益岗位项目	为2022年度滕州市乡村公益岗位提供补助	79.5	530
4	台儿庄区		2022年度台儿庄区公益岗位补助项目	为2022年台儿庄区乡村公益岗位提供补助	24.84	166
5	市中区		2022年度市中区乡村公益岗位补助项目	为2022年市中区乡村公益岗位提供补助	22.5	150
6	山亭区		2022年度山亭区乡村公益岗位补助项目	发放乡村公益岗位工资	320	2200
7	高新区		2022年度高新区乡村公益岗位补助项目	发放乡村公益岗位工资	9.45	63
8	市乡村振兴发展中心		脱贫享受政策和防止返贫监测帮扶对象意外伤害保险	为枣庄市脱贫享受政策人口和防止返贫监测帮扶对象购买意外伤害商业补充保险	354.3	663
合计					869.85	4100
